

工程部週報

2026/08/10 ~ 2026/08/14



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

- 1. 支架組裝 25%：**假固定**

- (立柱 100%、橫樑 100%、次樑 100%、斜撐100%、C 鋼100%)

- 2. 8/12 儲能櫃、模組吊掛作業

- 追蹤事項：

- 1. 追蹤後續監控螢幕、4mm2 DC 線...等物料進場及施工人員進場

吊掛



吊掛



台以八翁 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 8/7 現場勘查漏水、施工堵漏

漏水現勘



漏水原因


- 8/7 下午現場漏水勘查

業主代表：林紹偉

吉發企業社代表：曾祥俊

勘查漏水原因為浪板接縫處，模組鋪設前，原本屋頂浪板有填補四條矽利康施工，
屋頂原本就會漏水

漏水原因

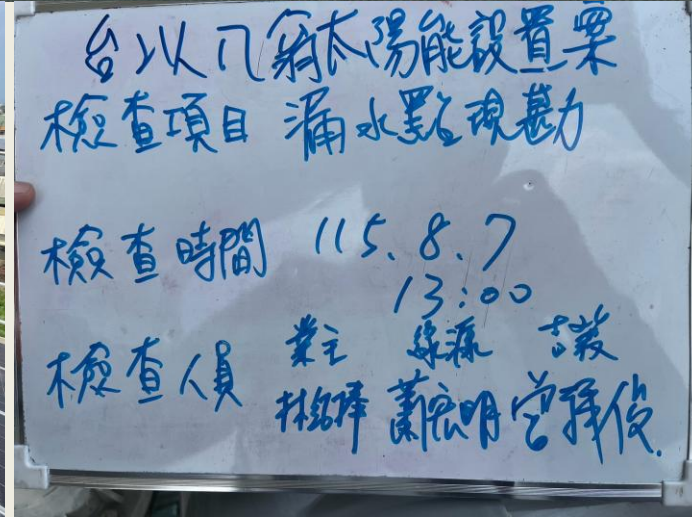

盛餘屏南 - 其民

- 工程事項：

1. 8/12 圖面與盛餘維運現場確認

2. 監控圖面細部修改



- 圖號 SP-PV-011 上表示該串列位置顏色有誤須再修改

- 圖號：SU-EA-007 未標示各 INV 編號

3. 臺電審訖圖（地面型）圖號：E-14 變壓器對應 INV 其 kWp 數值錯誤

- 追蹤事項：

1. 圖面修改追蹤

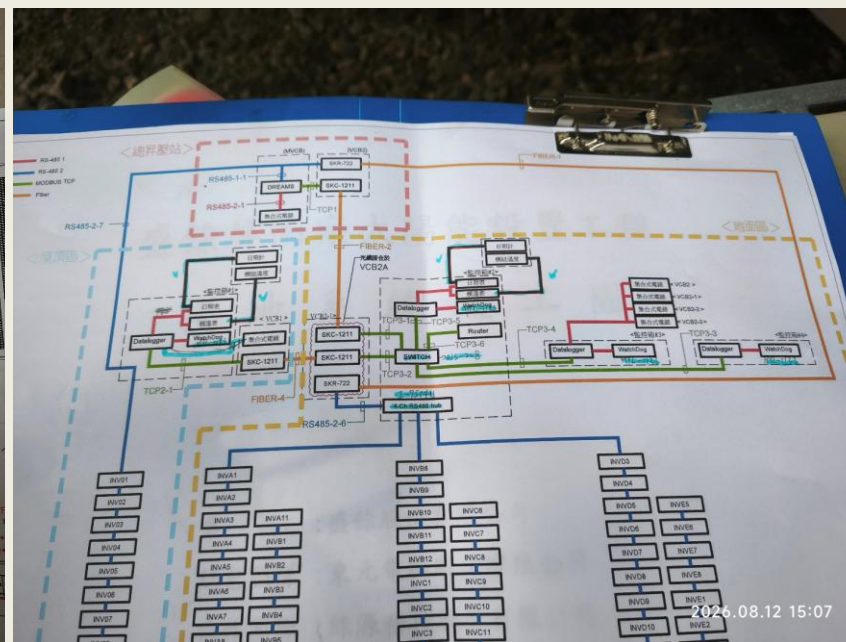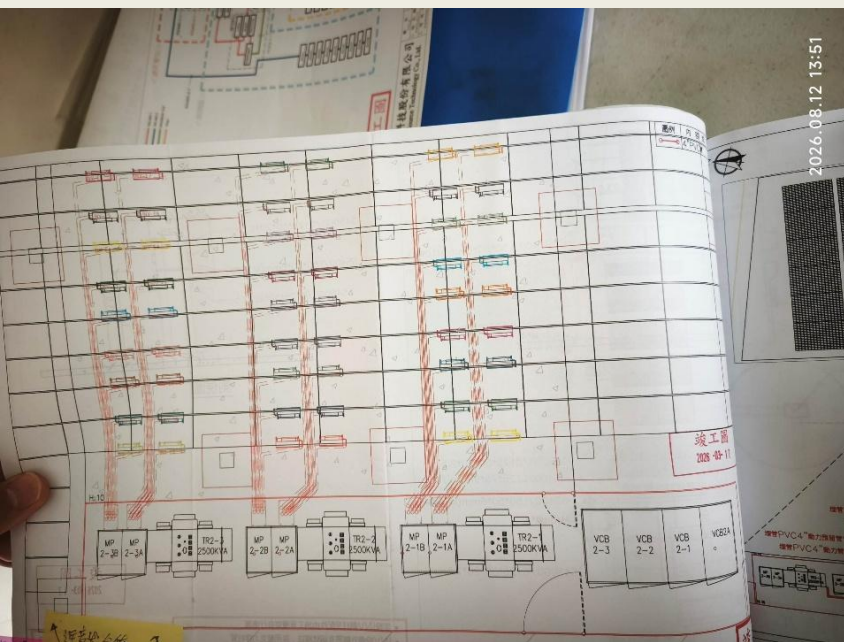

管理用 2-2 2405.84kW (PV: 580W)	
MP 2-1	INV X
INV A1	133.4kW (18串11併+16串2併)x4台
INV A2	
INV A3	
INV A4	
INV A5	
INV A6	
INV A7	
INV A8	
INV A9	
INV A10	
INV A11	
INV A12	
INV B1	
INV B2	
INV B3	
INV B4	
INV B5	
INV B6	
INV B7	


管理用 2-3 2409.32kW (PV: 580W)	
MP 2-3	INV X
INV D3	133.4kW (18串11併+16串2併)
INV D4	134.56kW (18串12併+16串1併)
INV D5	
INV D6	
INV D7	133.4kW (18串3併+16串11併)x5台
INV D8	
INV D9	
INV D10	134.56kW (18串4併+16串10併)
INV D11	134.56kW (18串12併+16串1併)
INV D12	133.4kW (18串3併+16串11併)
INV E1	
INV E2	
INV E3	
INV E4	
INV E5	
INV E6	133.4kW (18串11併+16串2併)x4台
INV E7	
INV E8	134.56kW (18串12併+16串1併)

管理用 2-2 2397.72kW (PV: 580W)	
MP 2-2	INV X
INV B8	133.4kW (18串11併+16串2併)x2台
INV B9	
INV B10	
INV B11	134.56kW (18串4併+16串10併)x2台
INV B12	133.4kW (18串3併+16串11併)
INV C1	134.56kW (18串4併+16串10併)
INV C2	12.96kW (18串2併+16串1併)
INV C3	133.4kW (18串11併+16串2併)
INV C4	134.56kW (18串4併+16串10併)
INV C5	133.4kW (18串11併+16串2併)
INV C6	134.56kW (18串4併+16串10併)x2台
INV C7	
INV C8	
INV C9	
INV C10	133.4kW (18串11併+16串2併)x6台
INV D1	
INV D2	

兆豐銀行 - 其民

- 工程事項：

1. 8/11 辛情收料
2. 8/12 模組、儲能櫃、線槽、INV 進料吊上

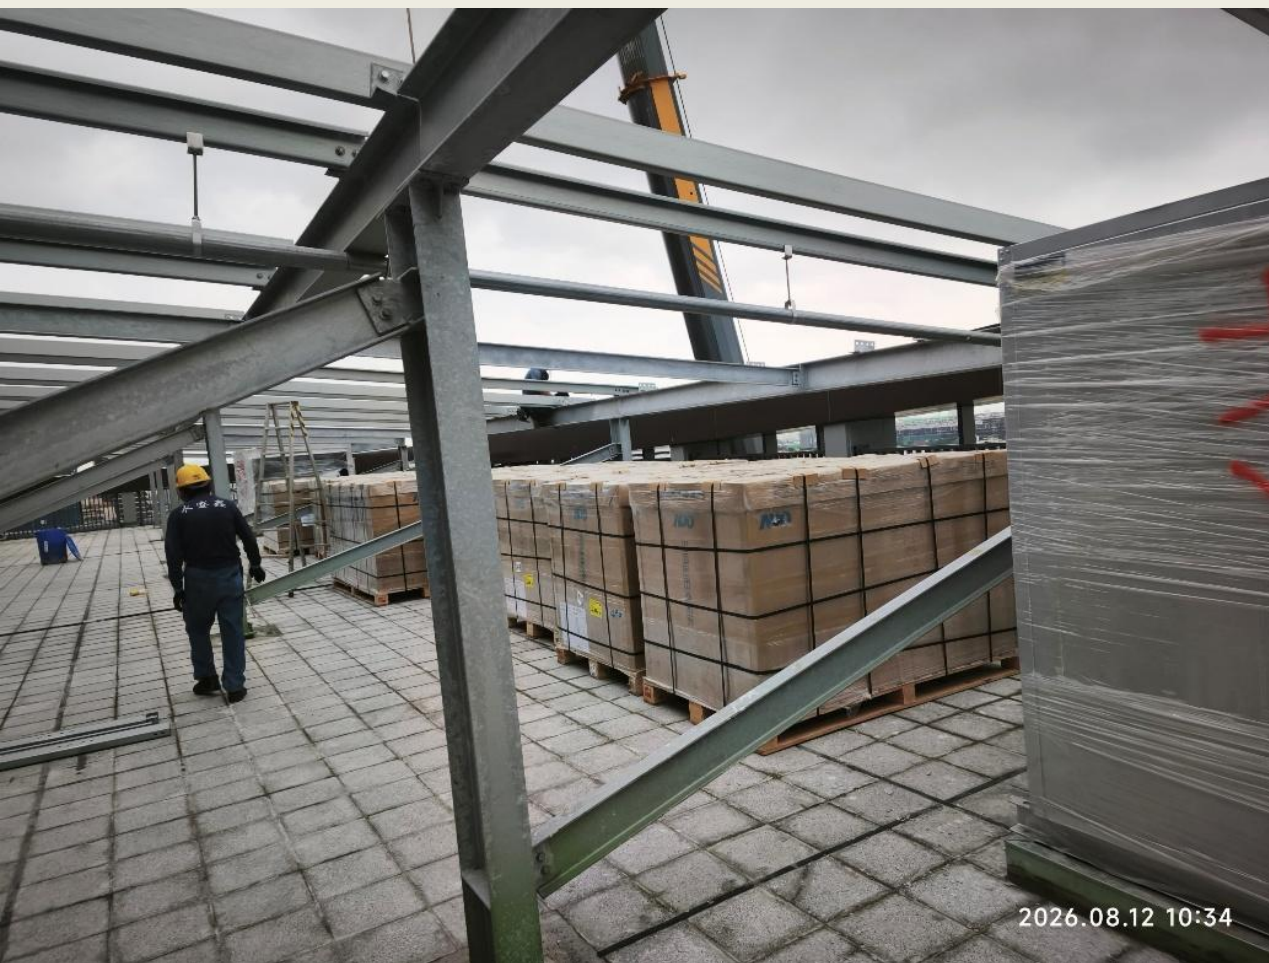

台積電 AP7 - 其民

- 工程事項：

1. 8/13 進場前教育訓練與相關注意事項（工安與申請）
2. 瞭解工單系統如何使用（AP6B、AP5B 皆由上包處理，此案須自行申請）
3. 工單已申請（8/14～8/31）
4. 協力商七員白卡已領取

- 追蹤事項：

1. 嘉義租屋
2. 8/17 台北開工前協議組織會議（與工班）

法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 99%

拉線進度 85%

絕緣導通測試 32%

儀表安裝 60%

儀表結線 36%

總進度 84%

案場協調項目：無

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無


施工進度表

五 JB箱至PLC拉設										
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	210	2026/1/20	2026/8/17	100%	
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	100%	180	2026/3/3	2026/8/29	80%	
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	100%	160	2026/3/23	2026/8/29	85%	
六 F區(110區)										
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	99%	
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	81%	150	2026/4/23	2026/9/19	85%	
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	32%	
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	67%	95	2026/5/28	2026/8/30	60%	
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	44%	80	2026/7/10	2026/9/27	30%	
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	36%	
七 測試驗收										
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%	
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%	
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	
343					83.6%	343 84.0%				

										二次側					總數	一次側					
										點位	配管	配線	導線&配線	斷路器線	儀表配線		配管	配線	導線&配線	點位	
6F	SA/B 1100	A/B 1102	D/B 1109	D/B 1100							數量: 37	37	37	37	37	37	4	4	4	4	
		24	10	3													4	4	4	4	
5F	SA/B 1100	D/B 1107	D/B 1109	A/B 1109	A/B 1101	A/B 1100	D/B 1101				數量: 115	115	115	115	115		7	7	7	7	
		14	15	24	23	24	15														
4F	S/D/B 1100	D/B 1102	AP/B 1100	A/B 1107	D/B 1100	D/B 1104															
	8	20	9	24	18	17															
	D/B 1103	A/B 1106	D/B 1107	A/B 1101	D/B 1101												12	12	12	12	
		20	24	15	24	20				數量: 390							12				
3F	S/D/B 1100	A/B 1102	AP/B 1100	D/B 1100	D/B 1100																
	17	23	14	12	18	12															
	D/B 1101	A/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	D/B 1102	A/B 1104											18	18		18	
	17	24	11	19	15	24															
	D/B 1100	A/B 1101	A/B 1103	D/B 1101	A/B 1101																
	17	24	24	24	24				數量: 319								18				
2F	SA/B 1100	S/D/B 1100	S/D/B 1100	AP/B 1100	D/B 1100	A/B 1100															
		16	22	16	15	21	24														
	D/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	A/B 1100	A/B 1100											14	14			
	24	23	23	23	24	24	24		數量: 279								14				
1F	SA/B 1100	S/D/B 1100	S/D/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	A/B 1102															
	7	19	10	17	17	14															
	D/B 1100	AP/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	D/B 1100	D/B 1100										18	18			
	24	17	19	24	23	24	19														
	A/B 1100	A/B 1100	A/B 1100	A/B 1100	A/B 1100				數量: 351								18				
	22	24	24	23	24																
										總數	1300	1253	670	447	351	37	73	73	73	23	41

F區儀表	總數	到料	已完成															拉線	配管	儀錶安裝	導線&配線	斷路器
	565	565	341															0.85	0.99	0.60	0.32	0.30

儀表安裝、配管工程

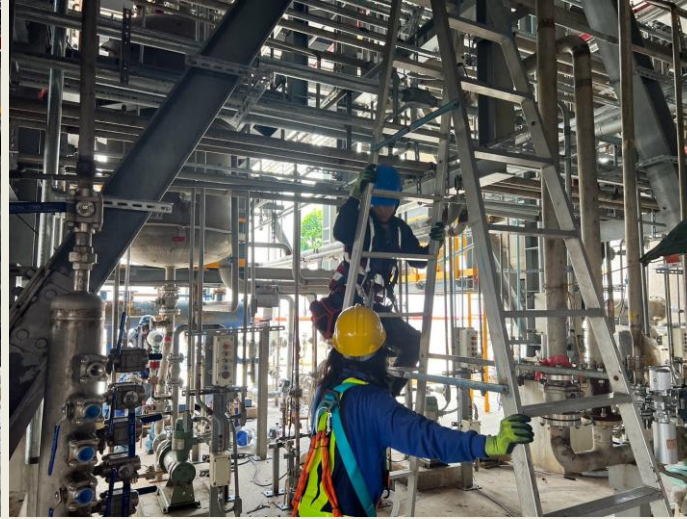

2026年8月11日 08:53:32
桃園市觀音區樹林里經建一路




2026年8月13日 14:59:13
桃園市觀音區樹林里經建一路



2026年8月13日 13:31:10
桃園市觀音區樹林里經建一路

儀表安裝、配管工程

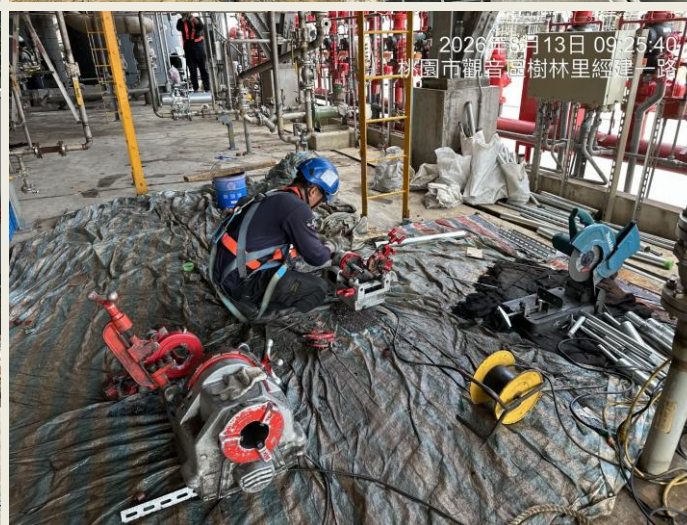

台積電 AP5B - 修原

- 工程事項：

1. 線槽踏板、支撐架安裝
2. 電器補土、線標套
3. 竣工資料整理、資料上傳
