

工程部週報

2026/08/17 ~ 2026/08/21



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

1. 支架組裝 26% (鋼構鏽點除鏽、清潔、上高鋅漆兩層 完成 50%)
2. 模組安裝 10%
3. 變流器安裝 90% (安裝固定完成尚未結線測試)

- 追蹤事項：

1. 追蹤後續監控螢幕、AC 盤體 ... 等物料進場及施工人員進場




支架組裝 26% (鋼構鏽點處理完成 50%)



兆豐楠梓分行-鋼構熱浸鍍鋅鏽點



模組安裝教育訓練

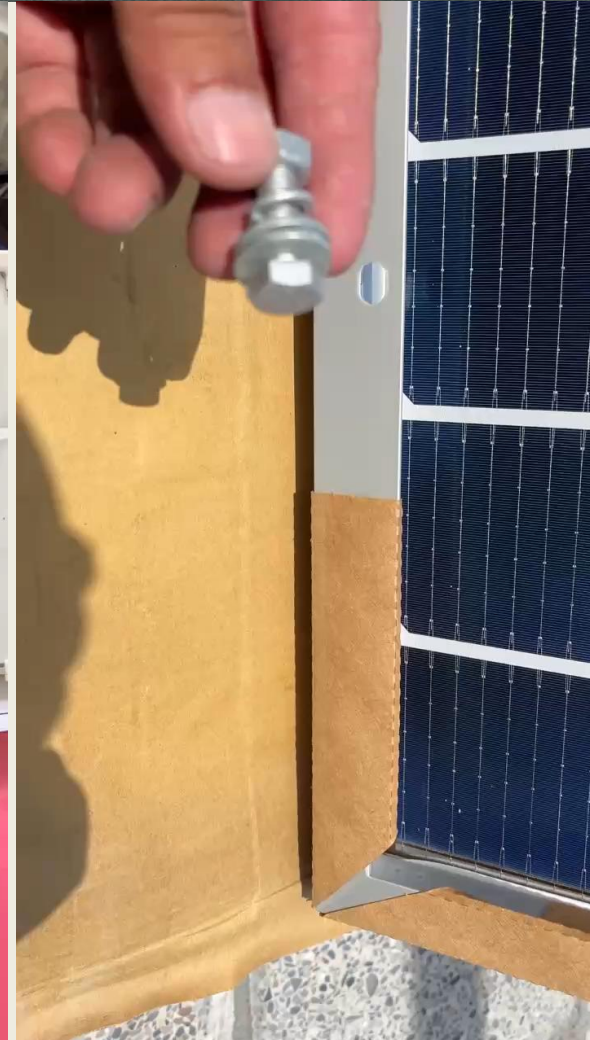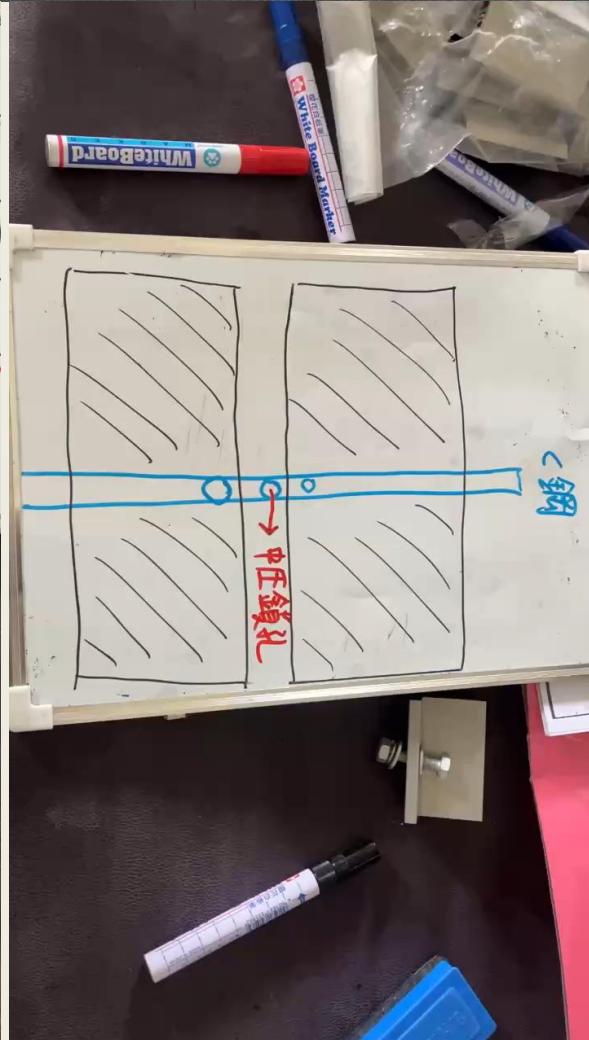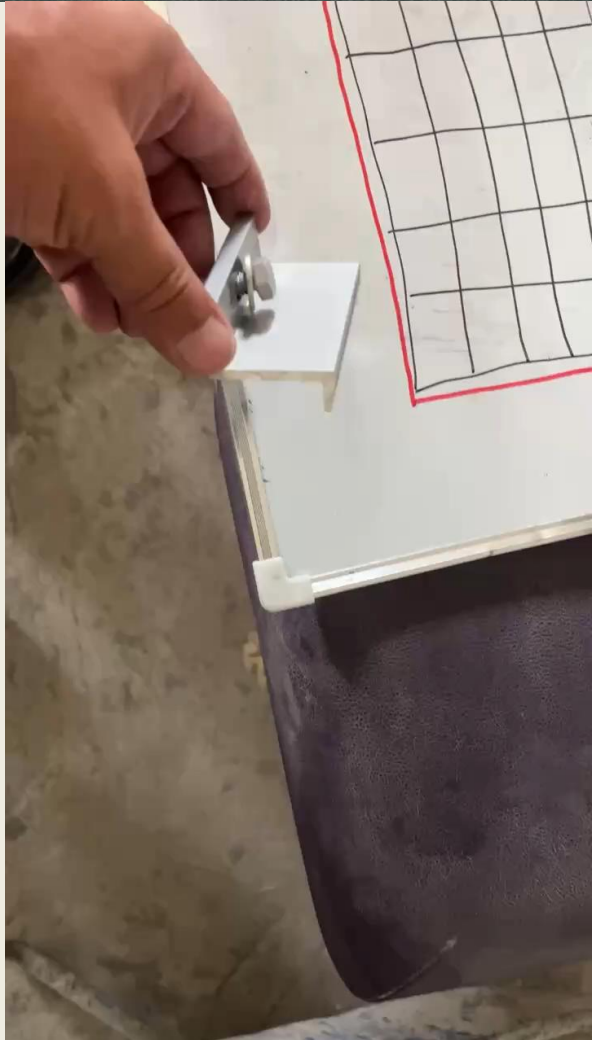

模組安裝



台以八翁 - 宏明

- 工程事項：

1. 8/7 現場勘查漏水、施工堵漏，觀察中

法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 100%

拉線進度 85%

絕緣導通測試 38%

儀表安裝 76%

儀表結線 57%

總進度 85.3%


案場協調項目：無

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無

施工進度表

五 JB箱至PLC拉設									
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	210	2026/1/20	2026/8/17	100%
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	100%	180	2026/3/3	2026/8/29	85%
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	100%	160	2026/3/23	2026/8/29	85%
六 F區(118區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	100%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	85%	150	2026/4/23	2026/9/19	85%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	21%	60	2026/7/1	2026/8/29	38%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	72%	95	2026/5/28	2026/8/30	76%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	30%	80	2026/7/10	2026/9/27	30%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	57%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343		84.0%		343		85.3%	




										二次側					盤數	一次側						
										點位	配管	配線	導通&絕緣	新體結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線		
6F	SAJB 1100	AJB 1102	DB 1109	JB 11010						數量: 37	37	37	37	37	37	4	4	4	4	4		
		24	10	3																		
5F	SAJB 1100	DB 11017	JB 11009	AJB 11019	AJB 11021	AJB 11020	DB 11018			數量: 115	115	115	115	115		7	7	7	7	7		
		14	15	24	23	24	15															
4F	SIDB 11006	DB 11015	APB 11004	AJB 11017	JB 11008	DB 11014					199	199	199	199			12	12	12	12		
	8	20	9	24	18	17																
	DB 11013	AJB 11016	JB 11007	AJB 11018	DB 11016																	
		20	24	15	24	20			數量: 399							12						
3F	SIDB 11005	AJB 11012	APB 11003	DB 11004	DB 11009	JB 11006																
	17	23	14	12	18	12																
	DB 11010	AJB 11010	JB 11004	DB 11008	DB 11013	AJB 11014				319	319	319				18	18		18			
	17	24	11	19	15	24																
	DB 11005	AJB 11011	AJB 11013	DB 11013	AJB-11015																	
	17	24	24	24	24			數量: 309							18							
2F	SAJB 1100	SIDB 11003	SIDB 11004	DB 11003	APB 11002	JB 11003	AJB 11009				279											
		16	22	16	15	21	24									14	14		14			
	DB-11004	DB 11005	DB-11005	DB 11007	AJB-11006	AJB 11007	AJB 11008															
	24	23	23	23	24	24	24	數量: 279							14							
1F	SAJB 11001	SIDB 11001	SIDB 11002	JB 11001	JB 11002	AJB-11023					351						18	18		17		
	7	19	10	17	17	14																
	DB 11001	APB 11001	DB 11001	DB 11001	DB 11002	DB 11003	DB-11020															
	24	17	19	24	23	24	19															
	AJB 11001	AJB 11002	AJB 11003	AJB 11004	AJB 11005			數量: 351							18							
	22	24	24	23	24																	
										總數: 1300	1300	670	670	351	37	73	73	73	23	72		
F區儀表										總數	到料	已完成						拉線	配管	儀表安裝	導通&絕緣	結線
										565	565	432						0.85	1.00	0.76	0.38	0.57

儀表安裝、配管工程



儀表安裝、配管工程

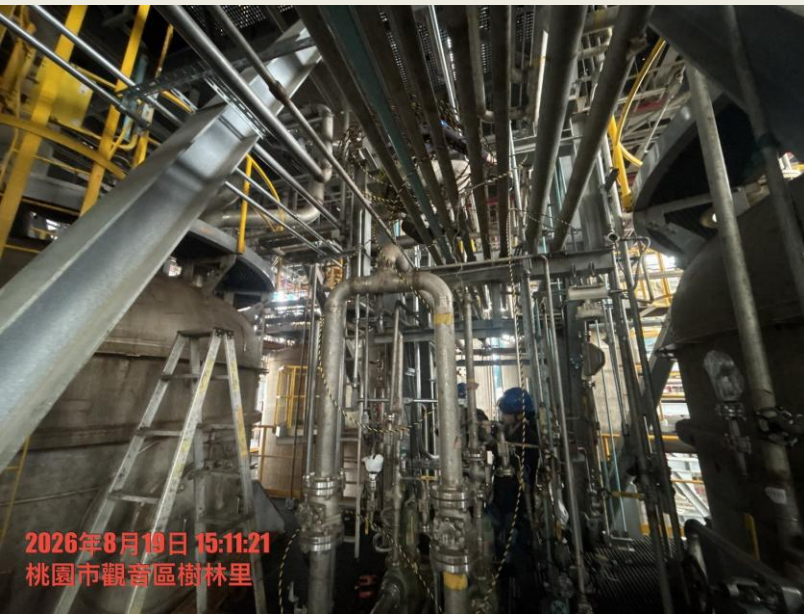

台積電 AP5B - 修原

- 工程事項：

1. 工程驗收
2. 缺失改善

- 追蹤事項：

1. 因台積電文件未通過無法進行拼接工程，協調工程款能否先請完
2. 8/27 送電試機（金展、綠源、宏耀、監控協力廠商）一同到現場測試

台積電 AP7 - 修原

- 工程事項：

1. 引導人員上課
2. 支援現場放樣、狀況

台積電 AP7 - 其民

■ 工程事項：

1. 8/17 台北開工前協議組織會議（與工班）
2. 8/20 開工進場，工具設備驗電，開立攜出單據
3. 因天候因素放樣延後
4. 與高信、根基、台積電三方確認就現況施作，不符合設計根基會另行改善

■ 追蹤事項：

1. 預計進料期程（因地面其他工程會影響吊掛位置與動線須預留部分）
2. 值筋作業人員白卡尚未辦過
