

工程部週報

2026/08/24 ~ 2026/08/28



台積電 AP7 - 其民

- 工程事項：

1. 8/27 現場放樣 (材料不夠隔日繼續)
2. 8/27 鑽孔測試 (6 墩座分別為北中南各隨機 2 座)
3. 8/27 台積電工單系統吊掛申請確認

- 追蹤事項：


1. 預計 8/28 全部墩座放樣確認狀況
2. 預計 9/3 吊掛相關工單申請與前置事項處置

○棟太陽能注意事項

- 週日（六日加班）須於週四中午前提報高信公安（人員加單數量與工項）並於公用電腦打單
- 夜間加班需打工單（夜間加班）一天一張可預先打，事後無加班日期須刪除該單據（無申請不得滯留現場）
- 目前五、六樓禁止人員進入，7 號電梯一樓～五、六樓（但不可到達七樓太陽能案場），4 號電梯一樓～四樓（於四樓走樓梯到達七樓案場）
- 物品攜帶攜出須於工單上填寫申請入廠單與攜出單（兩單分開須審核同意，要提早申請）
- 物料進場提早通知高信監工（現場監看）、公安（現場監看）、品管（準備驗料）
- 車載物料進場需提早打單，填寫司機姓名、電話、車牌、載運之物料，司機攜帶進料單開往西二哨（引導人員持白卡進場後，於西二哨等待車輛，驗單後陪同進場並於車輛進出與轉彎時引導車輛）

8/27 O棟試鑽孔植筋深度測試

- 6 水泥墩座測試分別為南北向各 2 座
- 最南端洩水坡度最底端，墩座較高 2 座各鑽 4 孔皆可達要求深度 11cm
- 於中間墩座 2 座各 4 孔有只有 1 孔鑽到鋼筋 (深度 5cm) 1/8 機率
- 於北端 (矮墩座) 2 座各鑽 4 孔有 3 孔鑽到鋼筋 (深度 5cm) 3/4 機率

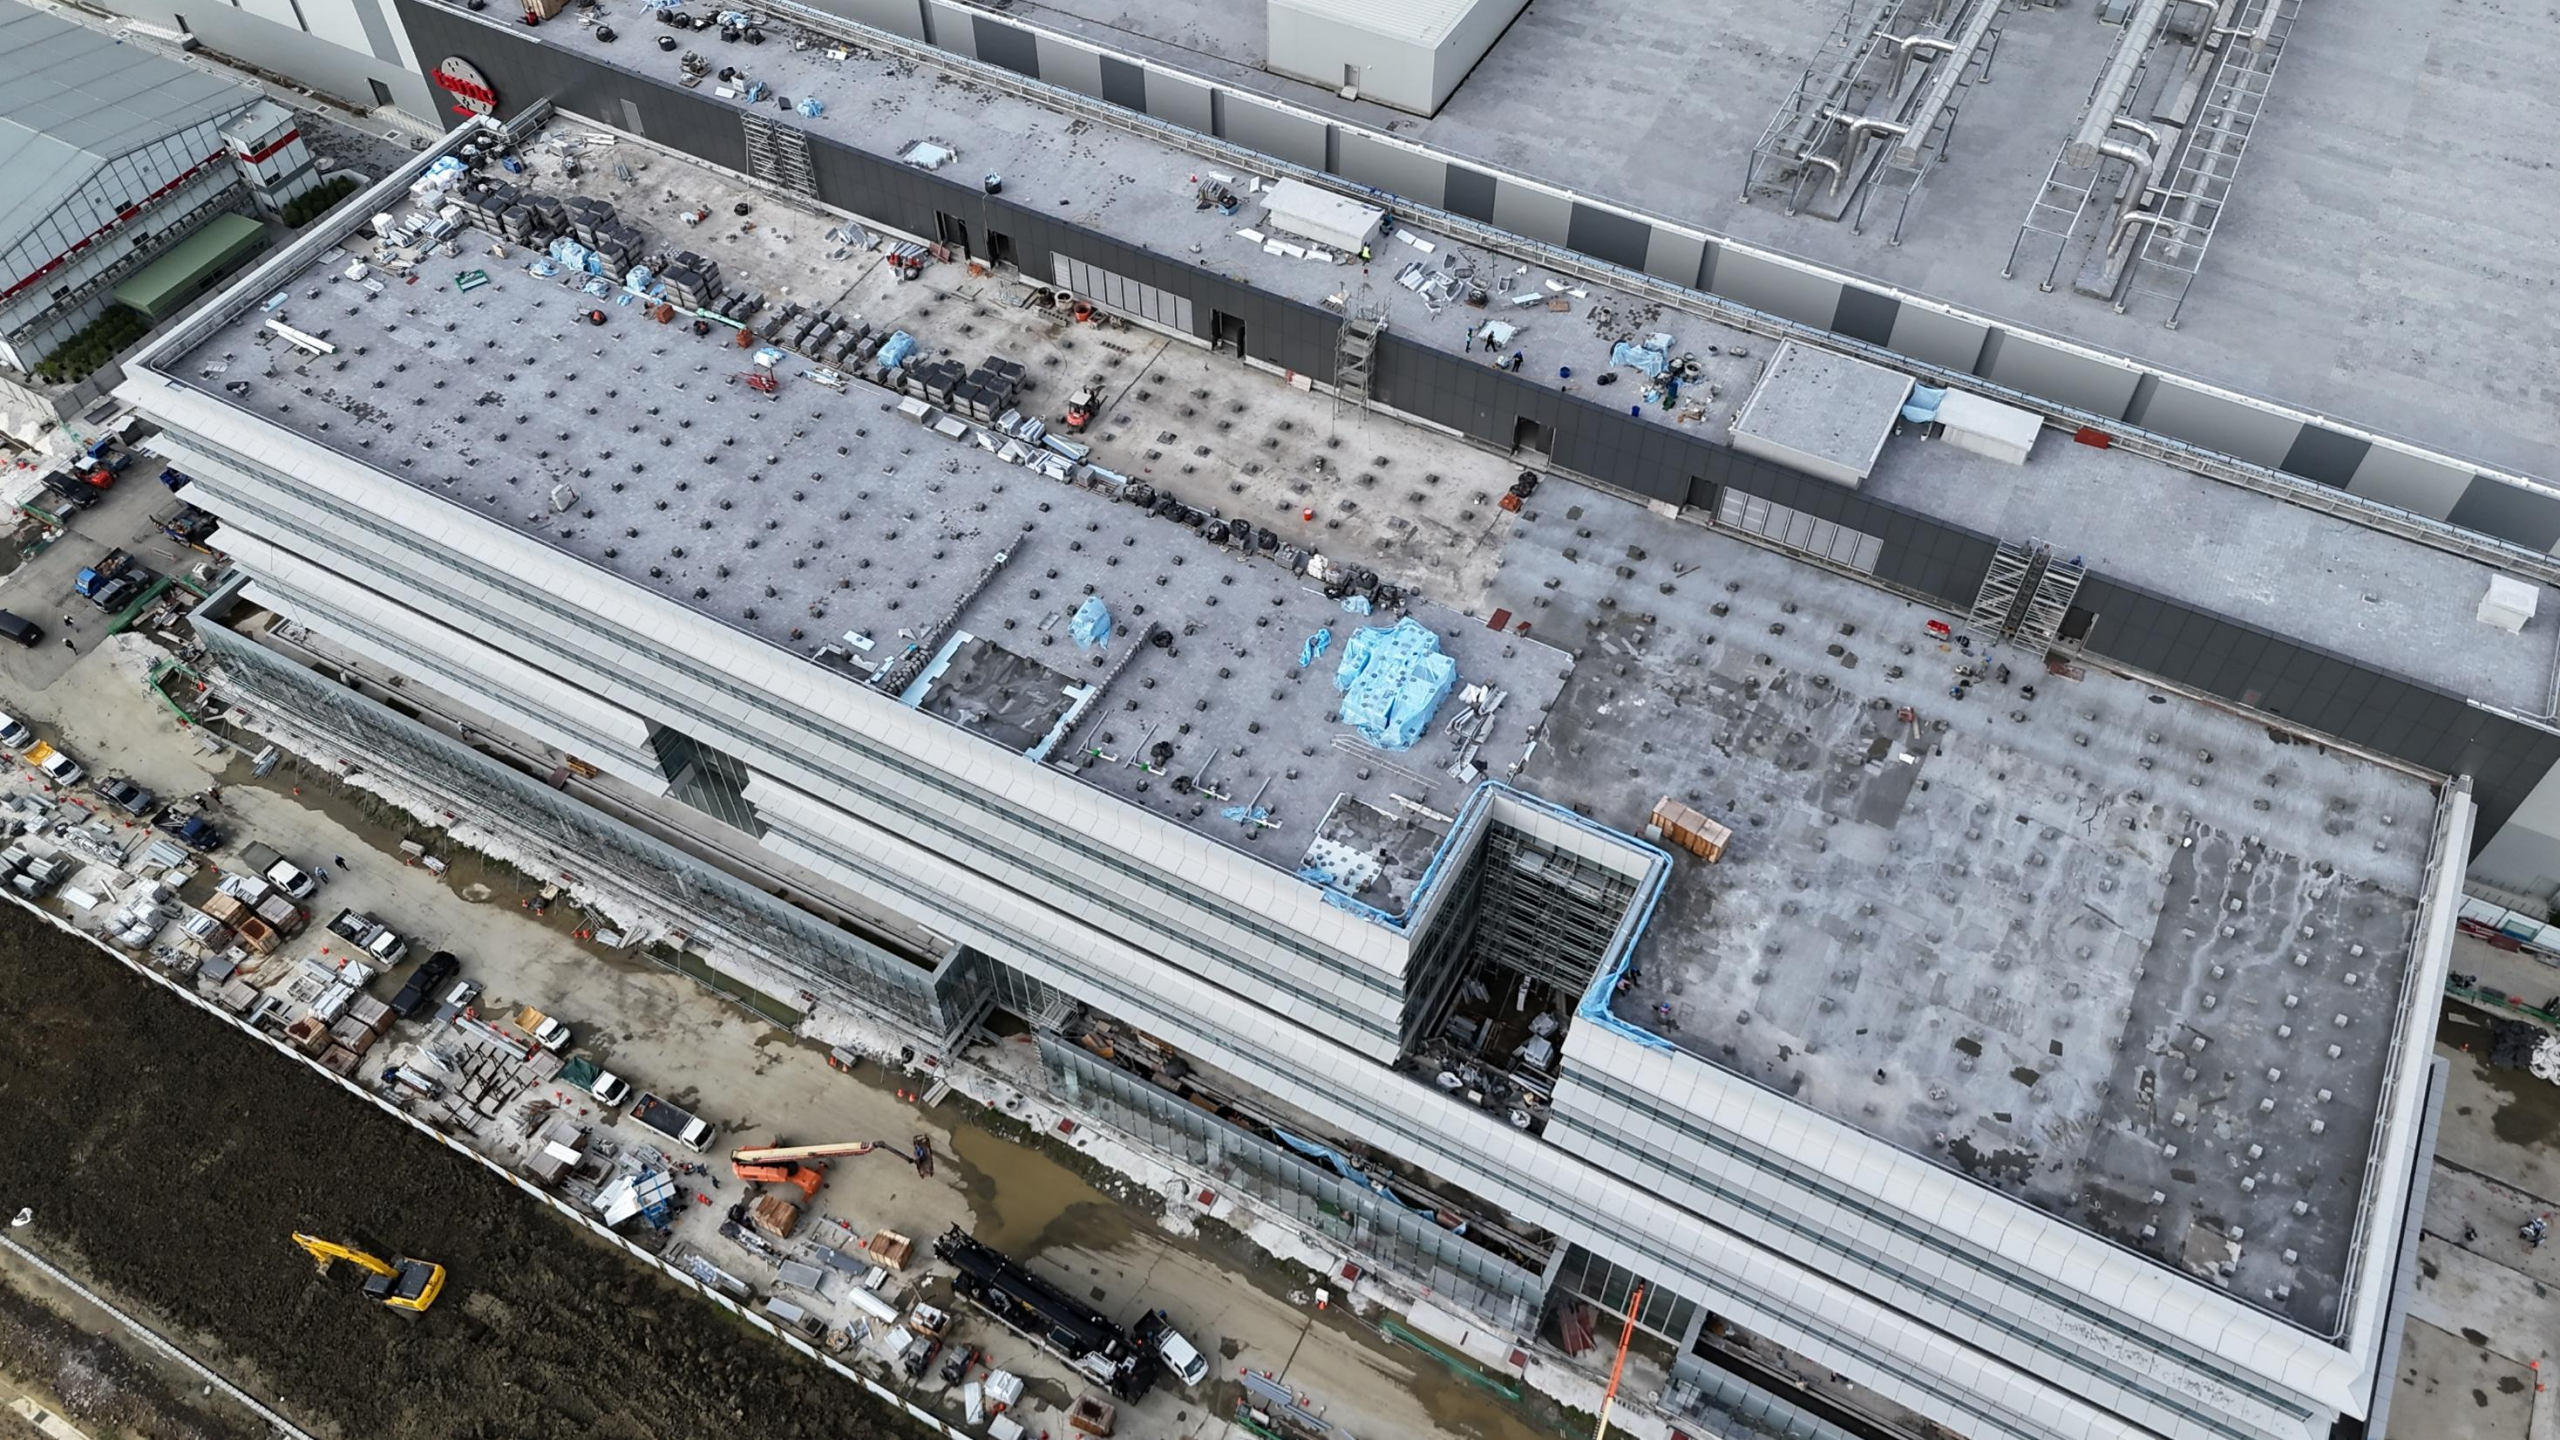



兆豐銀行 - 宏明

■ 工程事項：

1. 支架組裝 26% (鋼構鏽點除鏽、清潔、上高鋅漆兩層 完成 50%)
2. 模組安裝 15% (模組板上棚架 40 / 414、模組螺絲定磅 0%、吊掛進料完成)
3. 變流器安裝 90% (安裝固定完成尚未結線測試)
4. 儲能櫃安裝 10%
(吊掛進料完成、監控拉線測試 0%、電纜接線 0%、充放電測試 0%)

■ 追蹤事項：

1. 追蹤後續監控螢幕、AC 盤體 ... 等物料進場及施工人員進場


模組安裝



台以八翁 - 宏明

- 工程事項：

1. 8/25 現場勘查漏水、施工工法及工序建議，內部審核中

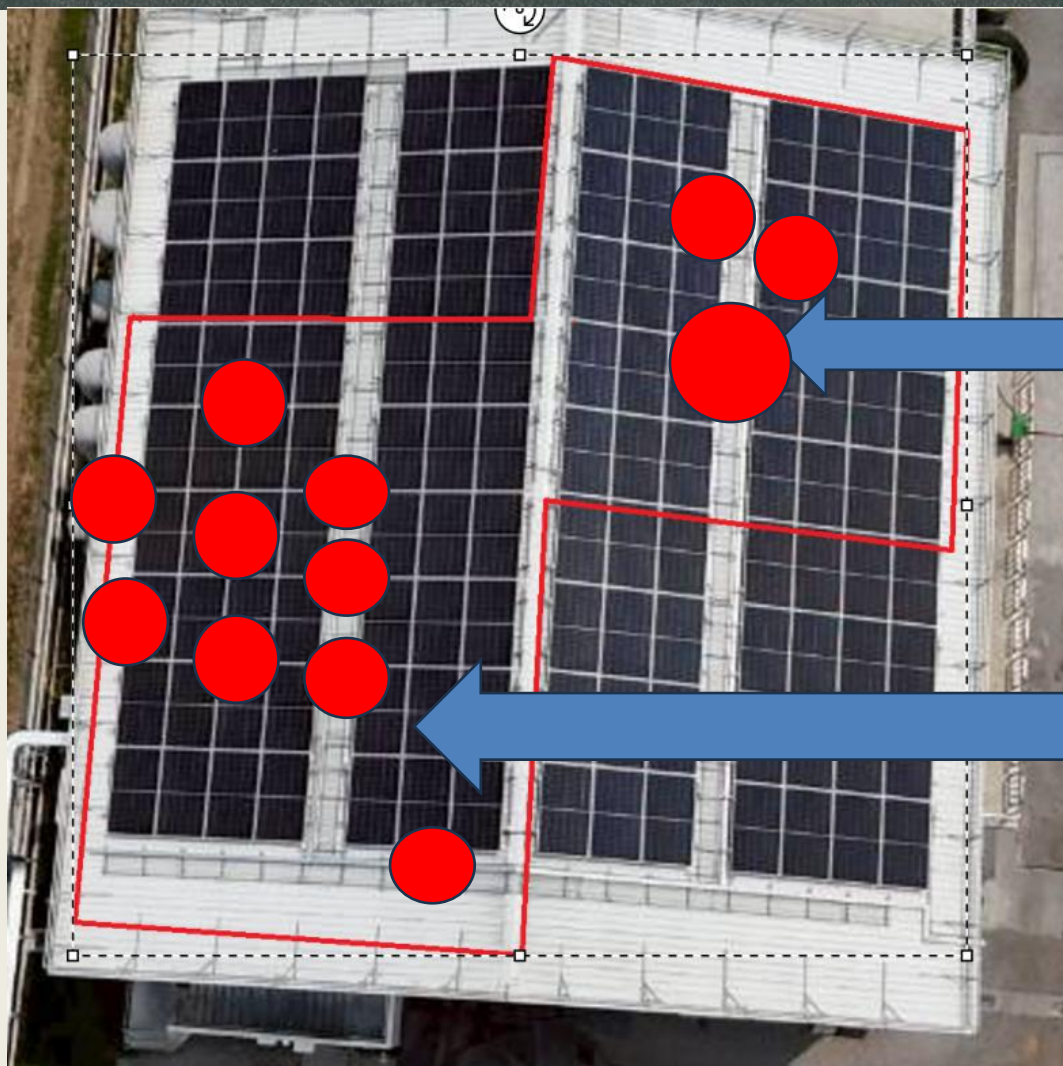

機房漏水點

辦公室漏水點

工法比較 & 工序

工法	比較	工時	費用	防水	耐候	施工難易	物料取得	總結
拆模組打膠填縫	優	V	V			V	V	V
	劣			V	V			
拆模組貼防水膜	優			V	V			
	劣	V	V			V	V	V

工序				
斷電	解接地串聯	拆模組 (77片)	解DC串聯	拆支撐架
1	2	16	2	8
防水施工	測漏	反順序回裝	接地測試	復電測試
?	8	29	1	1

法蘭摩沙 - 鎮寶、名淙、俊雄

F 區配管進度 100%

拉線進度 88%

絕緣導通測試 70%

儀表安裝 80%

儀表結線 57%

總進度 86.3%

案場協調項目：無法安裝清單已回復業主，待安排修改

1. F 區主管路尺寸不合更改，TIT 儀表拆除
2. 於 113 顆儀錶待安裝（含 83 顆無法安裝須改管路）

施工進度表

五 JB箱至PLC拉設									
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	210	2026/1/20	2026/8/17	100%
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	100%	180	2026/3/3	2026/8/29	85%
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	100%	160	2026/3/23	2026/8/29	85%
六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	100%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	89%	150	2026/4/23	2026/9/19	88%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	53%	60	2026/7/1	2026/8/29	70%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	77%	95	2026/5/28	2026/8/30	80%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	30%	80	2026/7/10	2026/9/27	30%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	57%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343			85.1%	343			86.3%



點位	二次側					盤數	一次側			
	配管	配線	導通&絕緣	箱盤結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線
數量: 37	37	37	37	37	37	4	4	4	4	4
數量: 115	115	115	115	115		7	7	7	7	7
數量: 199	199	199	199	199		12	12	12	12	12
數量: 319	319	319	319			18	18	18	18	18
數量: 279	279	95	76			14	14	14	14	14
數量: 351	351					18	18	18		17
總數: 1300	1300	765	746	351	37	73	73	73	55	72
F區儀表	總數	到料	已完成	拉線	配管	儀表安裝	導通&絕緣	結線		
	565	565	452	0.88	1.00	0.80	0.70	0.57		

儀表安裝、配管工程



儀表安裝、配管工程

