

工程部週報

2026/07/20 ~ 2026/07/24



台以八翁 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 6/27 漏水：防漏施工東側 $4 \times 9 = 36$ 片模組區塊下方，巴威颱風過後堵漏區塊未發現漏水情事
2. 7/18 清洗水路 - 濾水桶漏水，維修廠商於 7/22 維修完成

- 追蹤事項：

1. 案場漏水：持續觀察中

接地測試箱鎖固、濾水桶漏水處理



良輝科技水電行

水世界生活館(<https://www.liang-buei.idv.tw>)

報價單

日期 2026/7/20

公司地址 高雄市橋頭區仕豐南路大同巷7號
郵遞區號 825

電話: 07-6112929 傳真: 07-6121497

報價有效期至 2026/8/31

客戶: 綠源科技股份有限公司 統一編號: 28696141
聯絡人: 洪麗二 0975221812

公司電話: 02-26416567 分機: 201
住址: 新北市汐止區大同路一段177號5樓(經緯中心A棟)

注意: 含5%的營業稅

商品	單價	數量	總計
A1型漏水維修	6000	1	\$6,000
5% 營業稅	\$300.00	1	\$300
不含施工			
合計			\$6,300

銀行帳號
215 花蓮第一信用合作社
0150 橋頭分社
帳號 15420000001674
戶名 良輝科技水電行
※請先轉帳後告知, 接洽聯絡人姓名手機

聯絡人陳先生: 0919437905



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

1. 支架組裝 25%：假固定

(立柱 100%、橫樑 100%、次樑 100%、斜撐100%、C 鋼100%)

2. 防水、高壓磚鋪設施工 70%，預計 7/27 完成鋪設，鋼構工班進場協調中，

吊掛作業 7/22 場勘完成目前進行估價作業

3. 鋼構熱浸鍍鋅鏽點清查 161 處已協請其民課長協調，模組組裝鎖固後一併處理

兆豐銀行 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 防水工程進度 - 防水施工預計完工時間 **7 月底**，調整模組、儲能櫃進場吊掛
正確時間預計 **8 月初**（持續追蹤）

防水進度

7/20屋頂隔熱磚施工現況(4/48)

陳其民課長

2026.7.20 下午 5:10



法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 87%

拉線進度 54%

絕緣導通測試 30%

儀表安裝 38%

儀表結線 36%

總進度 81.1%

案場協調項目：其餘工項暫緩先以 1、2 F 一二次側配管為主，目標配管拉線 8/31 完成

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無



施工進度表

五 JB箱至PLC拉設									
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	190	2026/1/20	2026/7/28	83%
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	99%	150	2026/3/3	2026/7/30	83%
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	97%	130	2026/3/23	2026/7/30	75%
六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	92%	120	2026/4/12	2026/8/9	87%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	66%	150	2026/4/23	2026/9/19	54%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	0%	20	2026/7/1	2026/7/20	30%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	50%	120	2026/5/28	2026/9/24	38%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	16%	80	2026/7/10	2026/9/27	16%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	36%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343			81.6%	343			81.1%



										二次側					盤數	一次側										
										點位	配管	配線	導通&絕緣	箱體結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線						
6F	SAIR 11004	AIB 11002	DB 11019	UB 11000								37	37	37	37	37		4	4	4	4					
		24	10	3						數量: 37						4										
5F	SAIR 11005	DB 11007	UB 11009	AIB 11009	AIB 11021	AIB 11020	DB 11018					115	115	115	115			7	7	7	7					
		14	15	24	23	24	15			數量: 115						7										
4F	SIDB 11006	DB 11015	APB 11004	AIB 11007	UB 11008	DB 11014																				
	8	20	9	24	18	17						199	199	199	199			12	12	12	12					
	DB 11013	AIB 11016	UB 11007	AIB 11018	DB 11016																					
	20	24	15	24	20					數量: 199						12										
3F	SIDB 11005	AIB 11012	APB 11003	DB 11004	DB 11009	UB 11006																				
	17	23	14	12	18	12																				
	DB 11010	AIB 11010	UB 11004	DB 11008	DB 11012	AIB 11014						319	271					18	18		18					
	17	24	11	19	15	24																				
	UB 11005	AIB 11011	AIB 11013	DB 11001	AIB 11015																					
	17	24	24	24	24					數量: 319						18										
2F	SAIR 11007	SIDB 11003	SIDB 11004	DB 11003	APB 11002	UB 11003	AIB 11009																			
		16	22	16	15	21	24					16						14								
	DB 11004	DB 11005	DB 11006	DB 11007	AIB 11006	AIB 11007	AIB 11008																			
	24	23	23	23	24	24	24			數量: 279						14										
1F	SAIB 11001	SIDB 11001	SIDB 11002	UB 11001	UB 11002	AIB 11003																				
	7	19	10	17	17	14																				
	DB 11001	APB 11001	DB 11001	DB 11001	DB 11002	DB 11003	DB 11020																			
	24	17	19	24	23	24	19																			
	AIB 11001	AIB 11002	AIB 11003	AIB 11004	AIB 11005					數量: 351						18										
	22	24	24	23	24																					
										總數	1300	741	622	351	351	37	73	73	41	23	41					
F區儀表										總數	到料	已完成									拉線	配管	箱體安裝	導通&絕緣	結線	
										604	379	232									0.54	0.87	0.38	0.30	0.36	

儀表安裝、配管工程

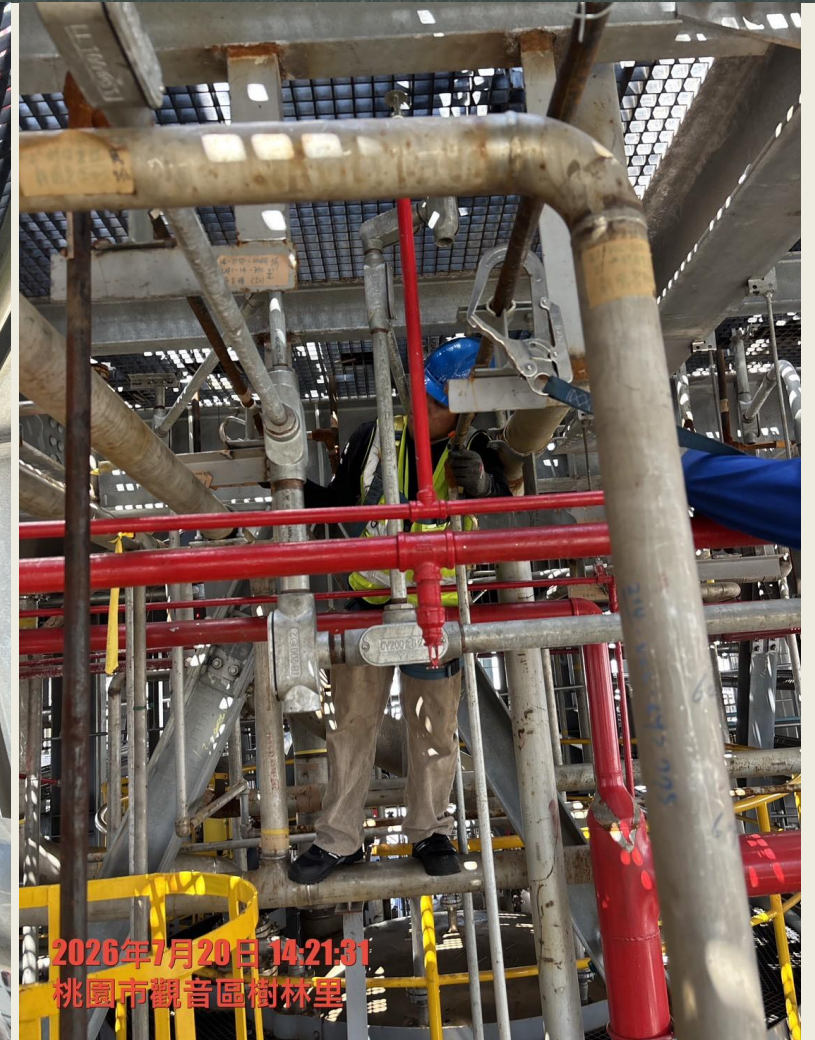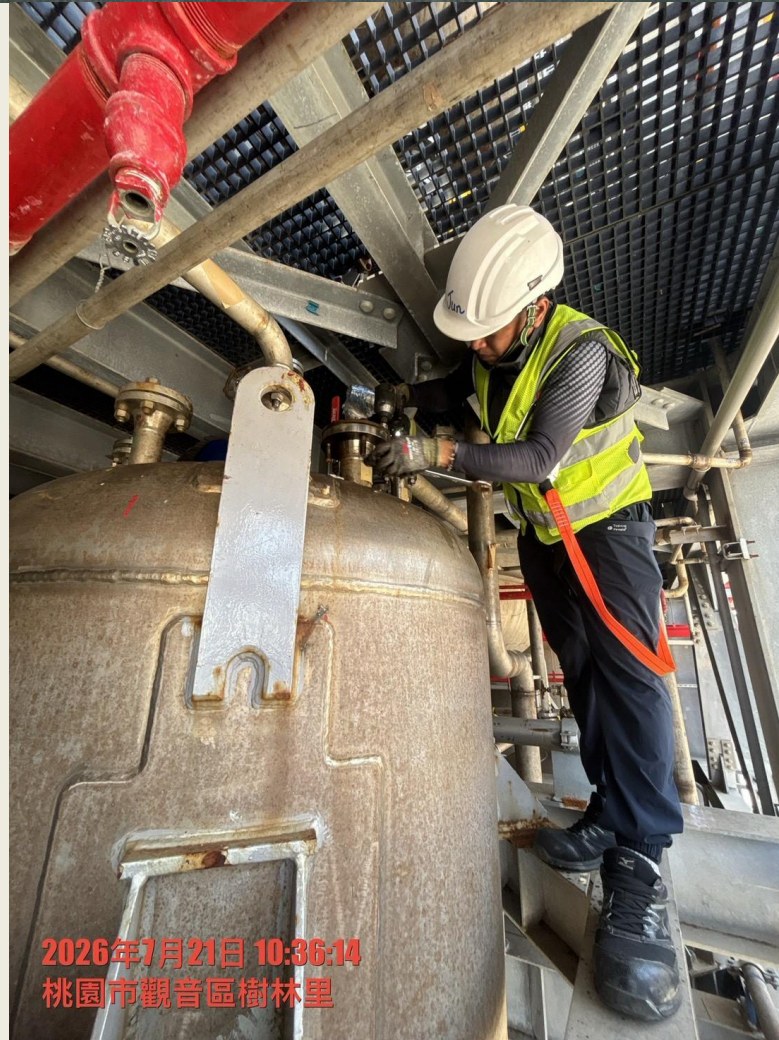

儀表安裝、配管工程



台積電 AP5B - 吳修原

- 工程事項：

1. 線槽安裝 (AC 100%、DC 100%)
2. 電氣室開孔 100%
3. 金屬軟管安裝開孔 (100% 預置完成)
4. 逆變器電壓值更正設定 (已重新設置 380V > 480V)
5. 拉 DC 線 10%
6. 竣工資料整理

- 追蹤事項：追蹤友達外部廠商協助進場設定
