

工程部週報

2026/08/03 ~ 2026/08/07




盛餘屏南 - 其民



- 工程事項：

1. 7/31、8/3、8/5 串列查核與現場比對
2. 8/5 熱顯空拍與遮陰比對

- 追蹤事項：

1. 8/13 圖面與盛餘維運現場確認

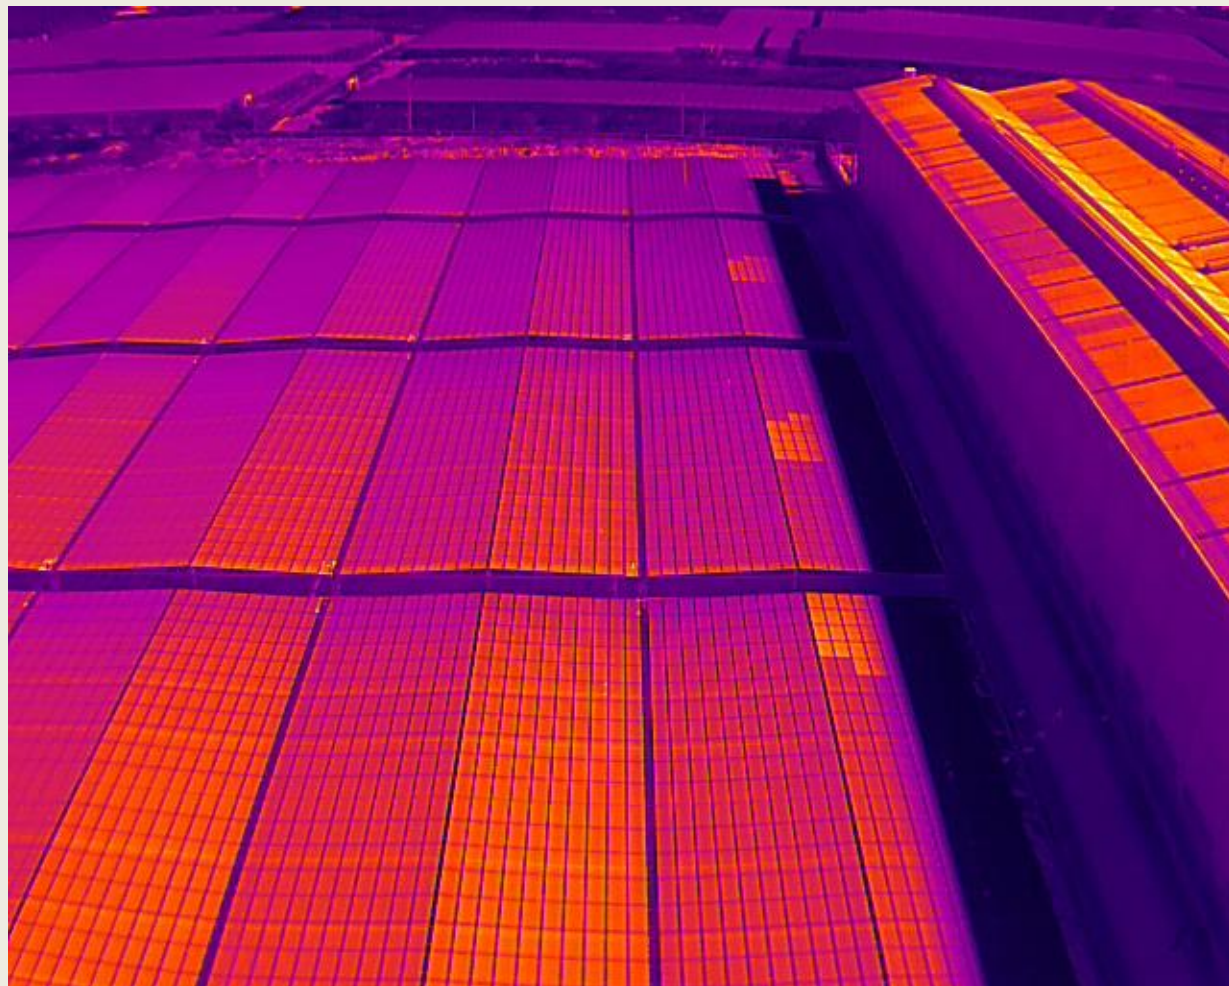

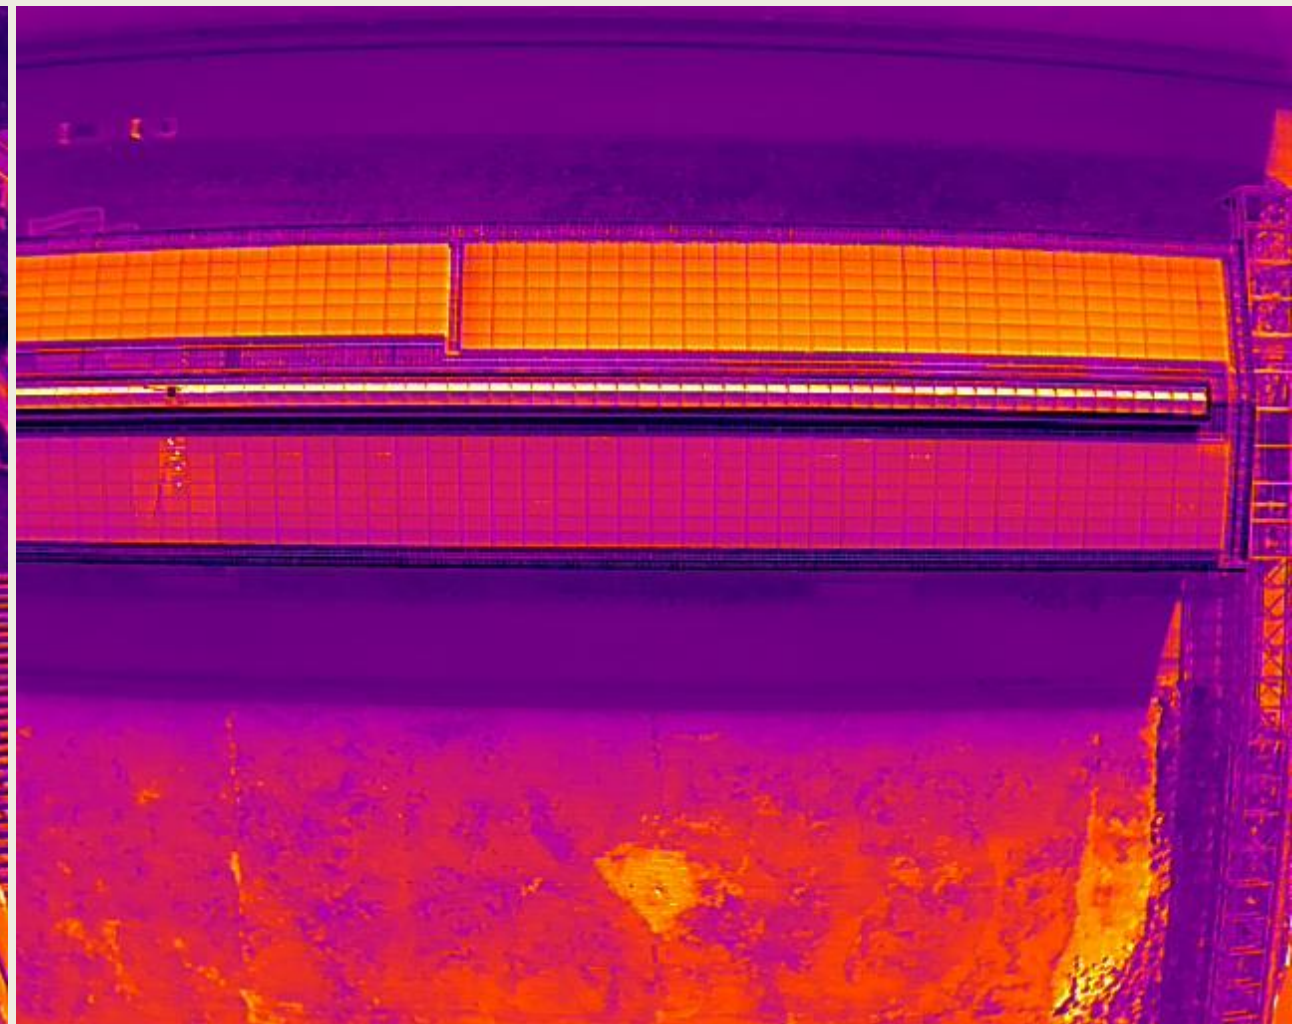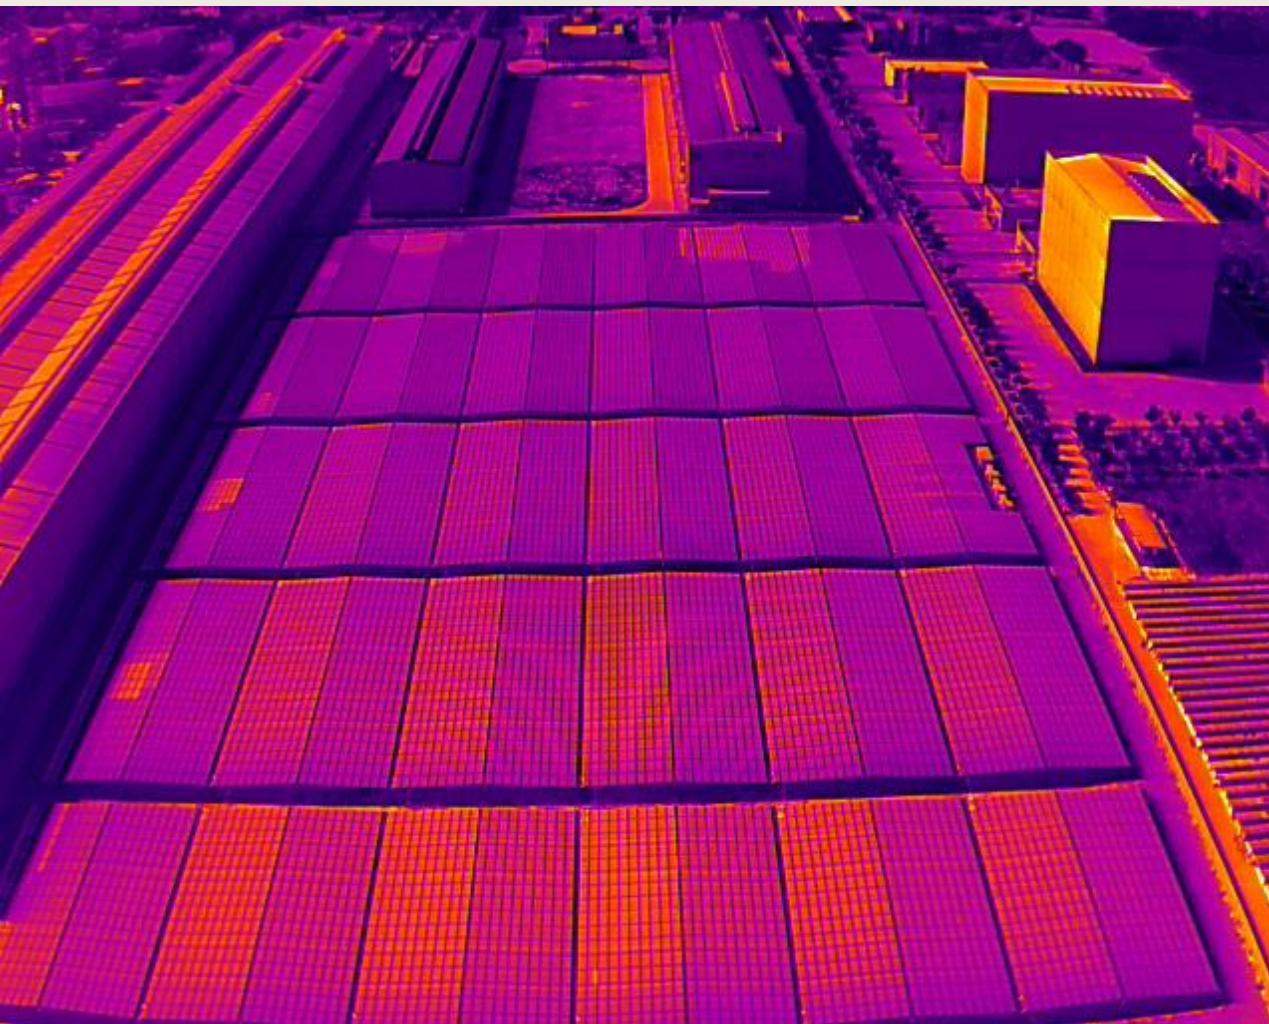

AP7 - 其民

8/6 進場前教育訓練與相關注意事項


1. 進場物料須提出材質證明與出廠證明與相關資料
2. 背牌認證事項（ 錨栓支撐需教育訓練後驗證， 線槽與線架組立需降育訓練考試後送驗證， 電力結線須電匠證照直接更換背牌 ）
3. 主要檢驗項目為第一組值筋後報請檢驗並示範施工流程方可後續施工， 後續檢驗項目為鏢絲定（ 已協調為模組鋪設後， 再行固定後定磅 ）

AP7 - 其民

- 追蹤事項：

1. 廠商進場且須教育訓練與了解相關事項
2. 材料備齊時間

8/05 空拍

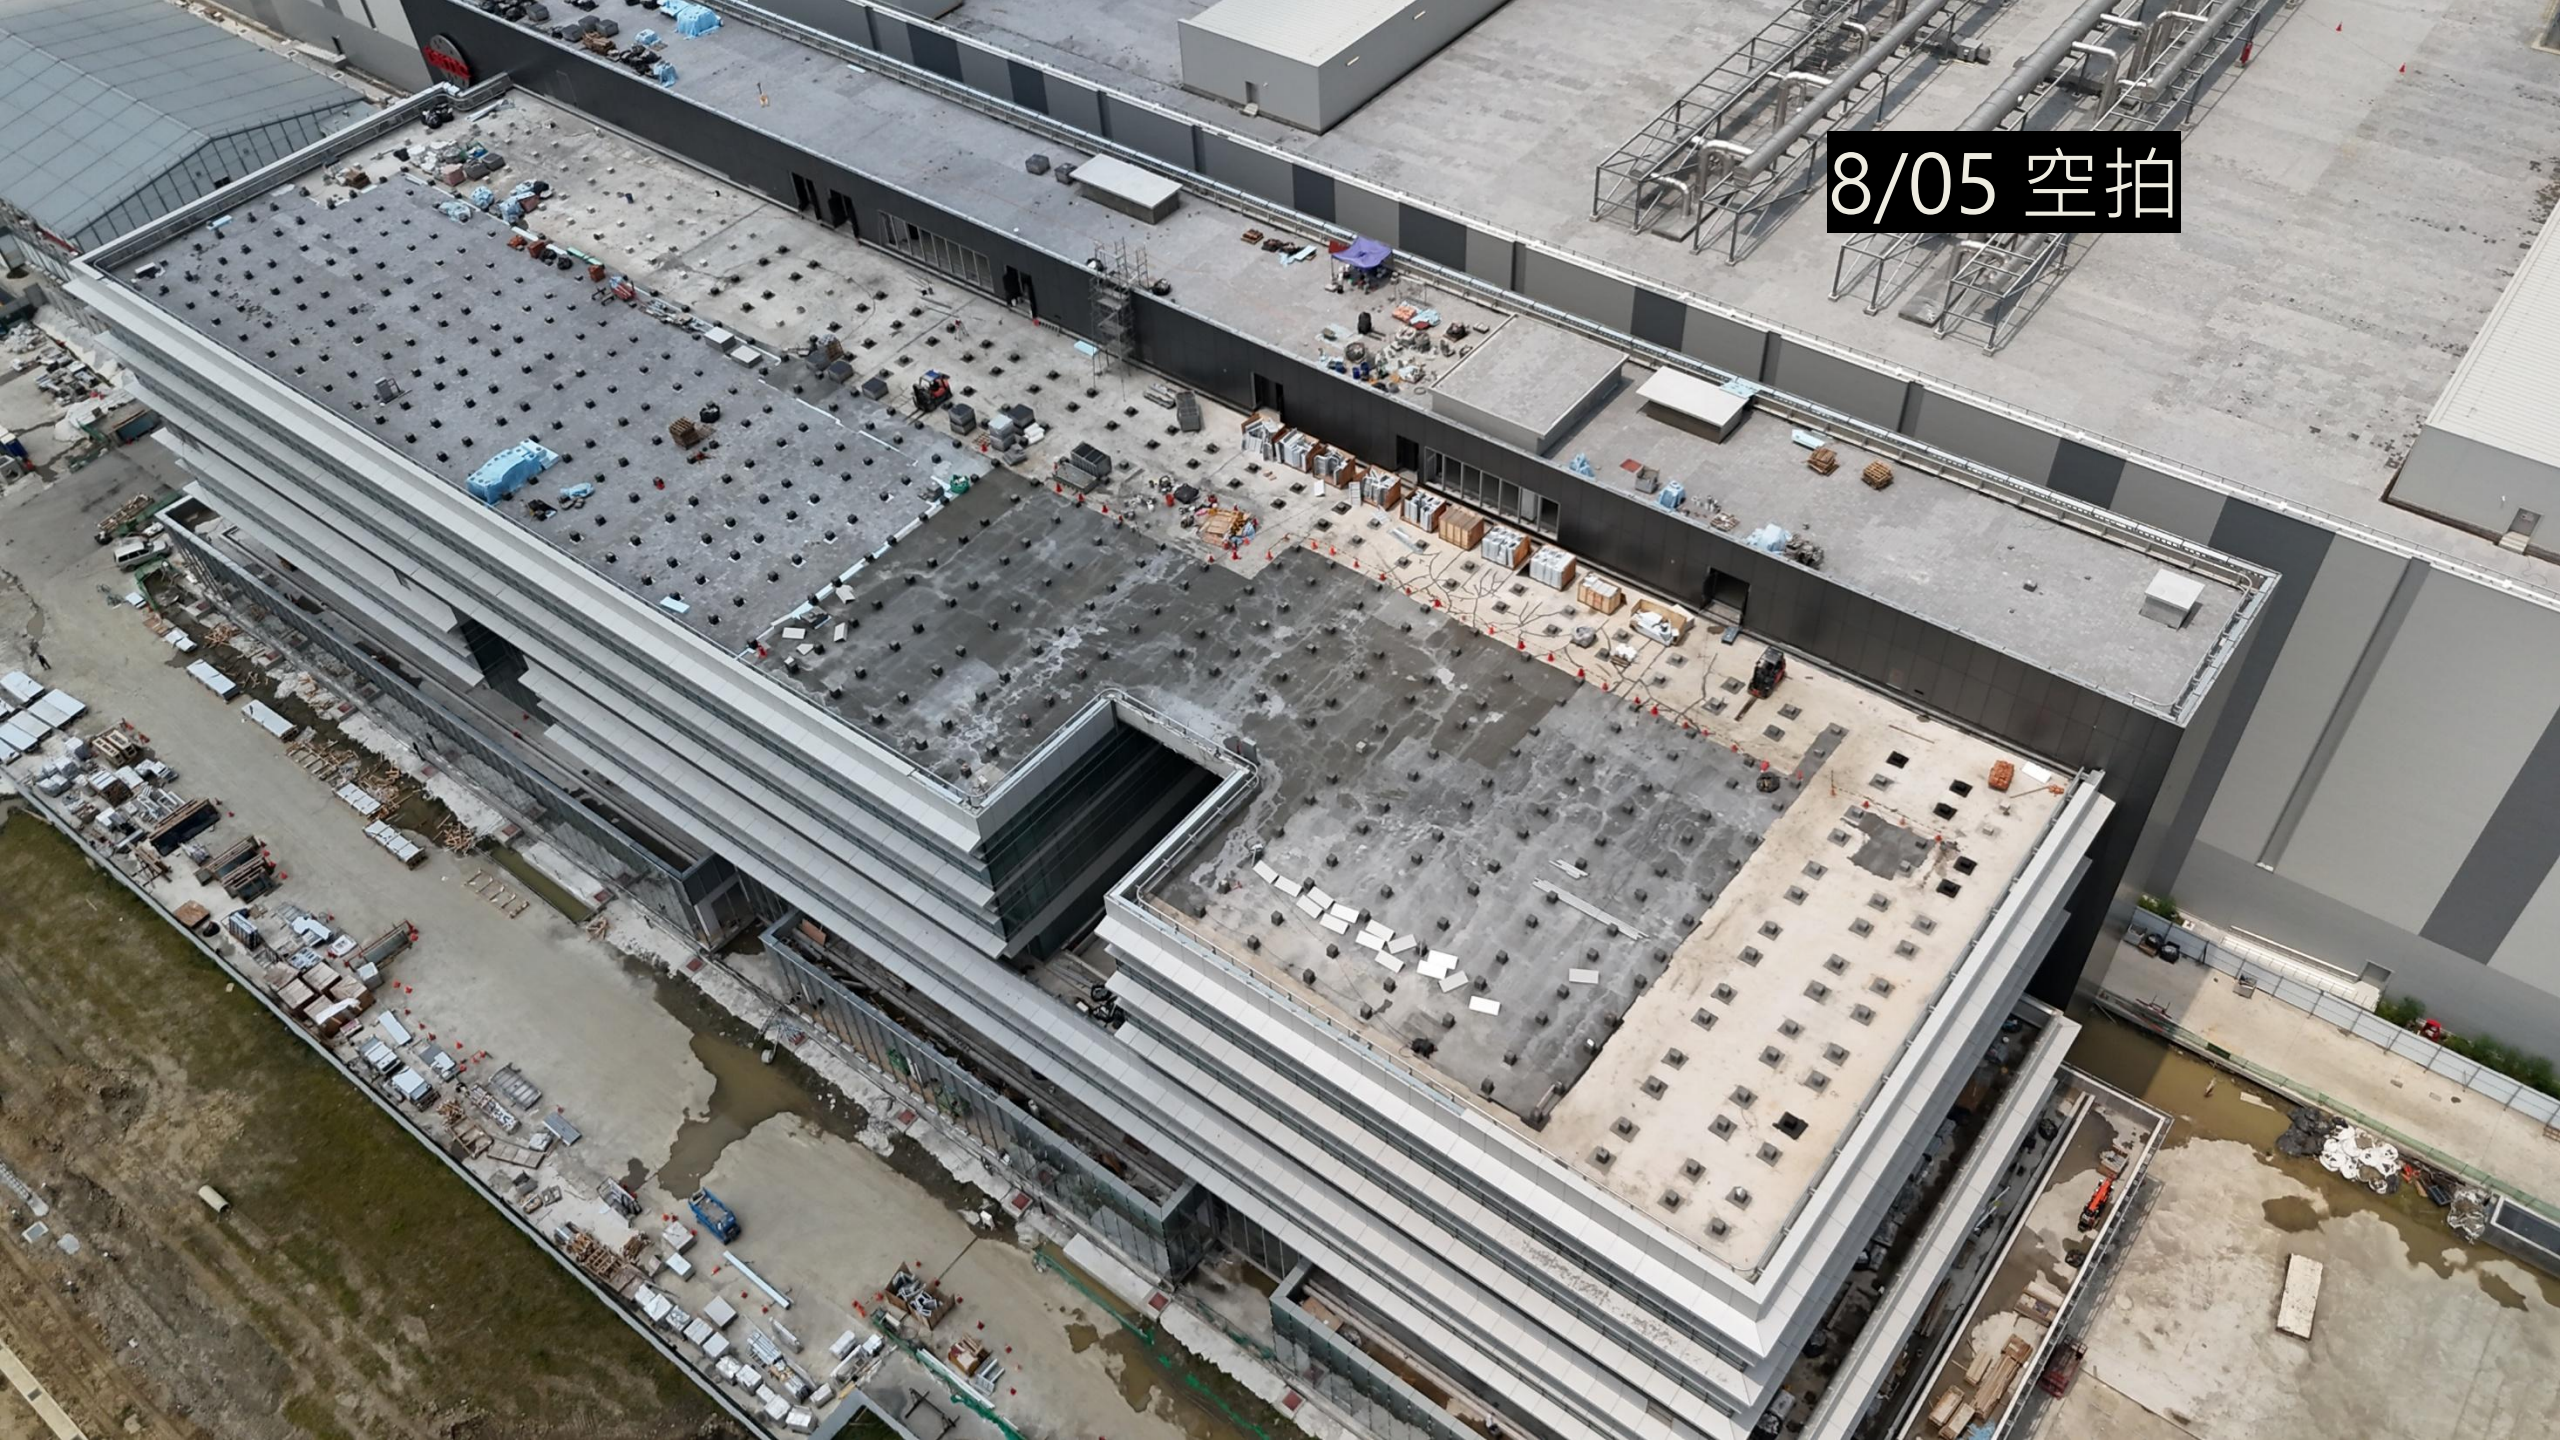



法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 88%

拉線進度 81%

絕緣導通測試 30%

儀表安裝 43%

儀表結線 36%

總進度 82.3%


案場協調項目：8/7 最後一批儀表進場

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無


施工進度表

六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	97%	131	2026/4/12	2026/8/20	88%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	70%	150	2026/4/23	2026/9/19	81%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	0%	51	2026/7/1	2026/8/20	30%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	55%	120	2026/5/28	2026/9/24	43%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	25%	80	2026/7/10	2026/9/27	25%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	36%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343		82.4%		343		82.3%	



												二次側					總數	一次側					
										點位	配管	配線	導通&絕緣	箱體絕緣	儀表絕緣		配管	配線	導通&絕緣	絕緣			
6F	SAIR 11006	AIR 11022	DIR 11019	DIR 11000						數量: 37	37	37	37	37	37	4	4	4	4	4			
5F	SAIR 11005	DIR 11017	DIR 11009	AIR 11019	AIR 11021	AIR 11020	DIR 11018				115	115	115	115		7	7	7	7	7			
4F	SIDIR 11006	DIR 11015	APR 11004	AIR 11017	DIR 11008	DIR 11014				數量: 115													
	8	20	9	24	18	17					199	199	199	199			12	12	12	12			
	DIR 11013	AIR 11016	DIR 11007	AIR 11018	DIR 11016																		
	20	24	15	24	20				數量: 199						12								
3F	SIDIR 11005	AIR 11012	APR 11003	DIR 11004	DIR 11009	DIR 11006																	
	17	23	14	12	18	12					319	271					18	18		18			
	DIR 11010	AIR 11010	DIR 11004	DIR 11008	DIR 11012	AIR 11014																	
	17	24	11	19	15	24																	
2F	DIR 11005	AIR 11011	AIR 11013	DIR 11011	AIR 11015					數量: 319						18							
	17	24	24	24	24																		
	SAIR 11002	SIDIR 11003	SIDIR 11004	DIR 11003	APR 11002	DIR 11003	AIR 11009				45						14	11					
	DIR 11004	DIR 11005	DIR 11006	DIR 11007	AIR 11006	AIR 11007	AIR 11008																
1F	24	23	23	23	24	24	24	24	數量: 279							14							
	SAIR 11001	SIDIR 11001	SIDIR 11002	DIR 11001	DIR 11002	AIR 11003					55												
	7	19	10	17	17	14											18	18					
	DIR 11003	APR 11001	DIR 11002	DIR 11003	DIR 11002	DIR 11003	DIR 11020																
	24	17	19	24	23	24	19																
	AIR 11001	AIR 11002	AIR 11003	AIR 11004	AIR 11005				數量: 351							18							
	22	24	24	23	24																		
										總數	1300	770	622	351	351	37	73	73	70	23	41		
F區儀表	總數	到料	已完成																拉線	配管	儀表安裝	導通&絕緣	絕緣
	604	379	260																0.81	0.88	0.43	0.30	0.36

儀表安裝、配管工程

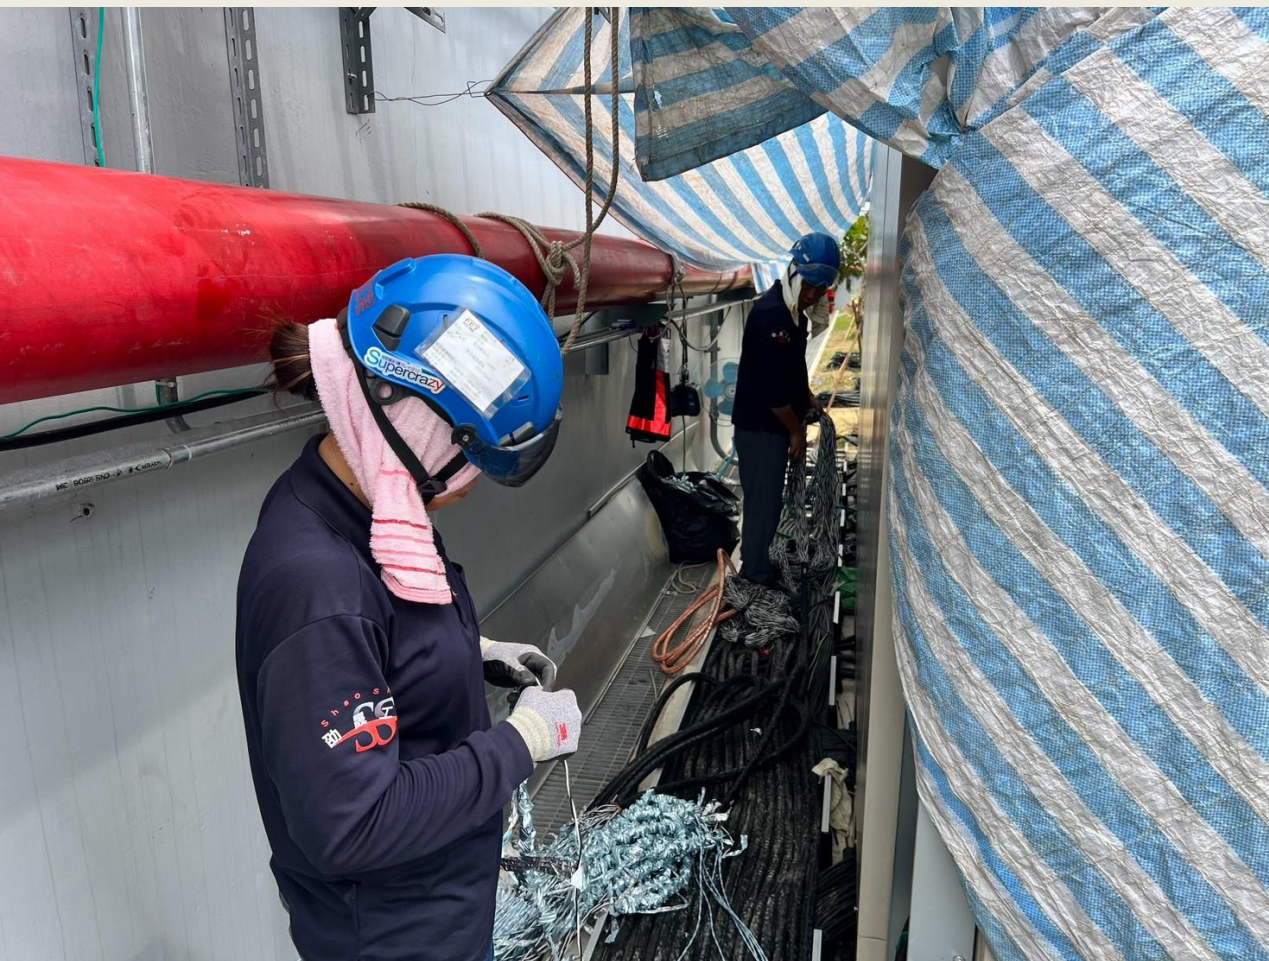

工程记录


拍摄时间: 2026.07.29 09:36

天气: 阴 28°C

地点: 觀音區·建國路145號

施工单位: 世新

儀表安裝、配管工程

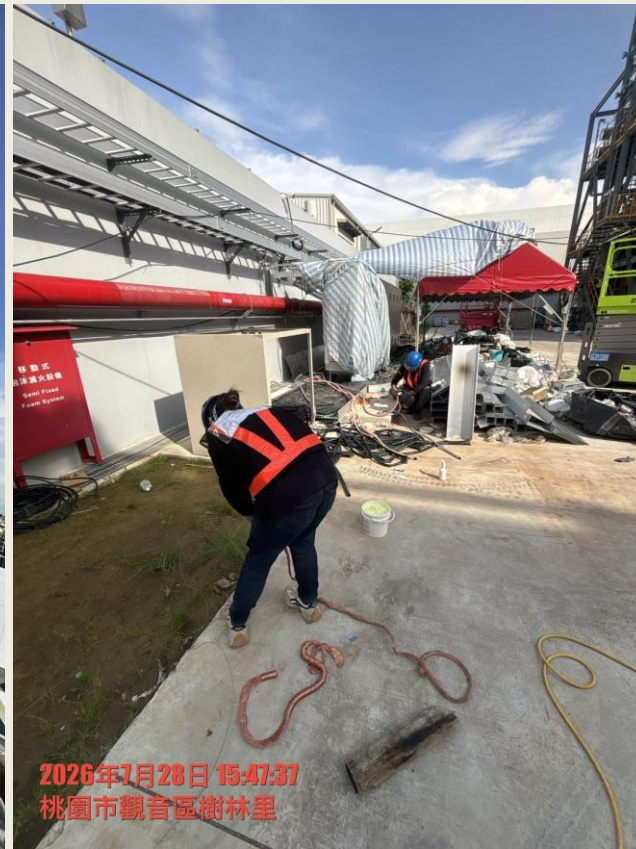

兆豐銀行 - 宏明

■ 工程事項：

1. 支架組裝 25%：假固定

(立柱 100%、橫樑 100%、次樑 100%、斜撐100%、C 鋼100%)

2. 辛晴鋼構工班進場協調中，吊掛作業完成估價作業，吊掛作業期程協調中

(預計 8/12 ~ 8/14 執行)

3. 鋼構熱浸鍍鋅鏽點清查 161 處已協請其民課長協調，模組組裝鎖固後一併處理

■ 追蹤事項：

1. 防水施工完工，調整模組、儲能櫃進場吊掛正確時間，預計 8/12 ~ 8/14 (持續協調)

防水進度、吊掛協調

4:06

5G

< 99+ 振興兆...部 (19)

陳其民課長

估價單辛晴
(115072...修改.pdf)

下載期限：~ 8/5 16:31
檔案大小：117.9 kB

下午 4:31

陳其民課長

@Jet Chan 專案管理 這一份報價單是儲能櫃單獨吊運的費用

下午 4:32

陳其民課長

因逢典與土建的因素，原訂 8/7 吊掛往後延至 8/12-14 實際日期待逢典與土建確認有無其他工項影響
辛晴方面與吊車已通知

下午 4:34

Jet Chan 專案管理

陳其民課長 @Jet Chan 專案管理 這一份報價單是儲...

收到 謝謝

下午 4:47

+

📷

📎

Aa

😊

🎤

估價單辛晴 (115072701永盛鑫)-修改.pdf



完成

高雄市中華一路350號5F 804

TEL: 5527529 FAX: 5527083

報價單

尊戶:辛晴工程有限公司

ES. NO.曾小姐

日期: 115年 7月 27 日

貨 名 Description	工作時間	數量Quantity	單價 Unit price	總 價 Amount	備註 Remakes
吊車160噸(加副桿)	半天	1		40,000	
吊掛手-假日	一天	2		9,100	
吊掛手-平日	半天	2		4,000	
115072801			總 價	53,100	(未含稅)

台以八翁 - 宏明


- 追蹤事項：

1. 6/27案場漏水：防漏施工東側 $4 \times 9 = 36$ 片模組區塊下方，7/28發現漏水情事。

- 追蹤事項：

1. 案場漏水：工班進場安排中。

漏水協調處理

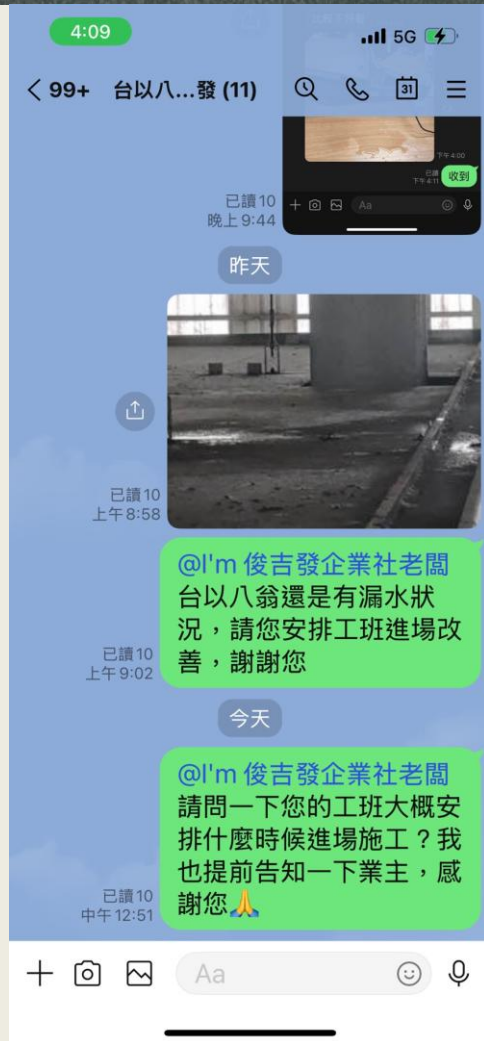

台積電 AP5B - 修原

■ 工程事項：

1. 線槽安裝 100%、線槽蓋 100%、通訊管 100%
2. DC 拉線 100%、AC 拉線 100%
3. DC MC4 結線 50%
4. AC、DC 主地線 100%
5. 逆變器掛設 100%

■ 追蹤事項：

1. 確認監控箱電源 220V
