

工程部週報

2026/07/27 ~ 2026/07/31



法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 88%

拉線進度 81%

絕緣導通測試 30%

儀表安裝 43%

儀表結線 36%

總進度 82.3%


案場協調項目：8/7 最後一批儀表進場

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無


施工進度表

六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	97%	131	2026/4/12	2026/8/20	88%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	70%	150	2026/4/23	2026/9/19	81%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	0%	51	2026/7/1	2026/8/20	30%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	55%	120	2026/5/28	2026/9/24	43%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	25%	80	2026/7/10	2026/9/27	25%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	36%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343			82.4%	343			82.3%



												二次側					總數	一次側												
												點位	配管	配線	導通&絕緣	箱體絕緣	儀表絕緣		配管	配線	導通&絕緣	絕緣								
6F	SAIR 11006	AIR 11022	DIR 11019	DIR 11000								數量: 37	37	37	37	37	37													
		24	10	3														4	4	4	4	4								
5F	SAIR 11005	DIR 11017	DIR 11009	AIR 11019	AIR 11021	AIR 11020	DIR 11018						115	115	115	115														
		14	15	24	23	24	15					數量: 115						7	7	7	7	7								
4F	SIDB 11006	DIR 11015	APB 11004	AIR 11017	DIR 11008	DIR 11014							199	199	199	199														
		8	20	9	24	18	17																							
	DIR 11013	AIR 11016	DIR 11007	AIR 11018	DIR 11016																									
		20	24	15	24	20					數量: 199											12								
3F	SIDB 11005	AIR 11012	APB 11003	DIR 11004	DIR 11009	DIR 11006							319	271																
		17	23	14	12	18	12																							
	DIR 11010	AIR 11010	DIR 11004	DIR 11008	DIR 11012	AIR 11014																								
		17	24	11	19	15	24																							
	DIR 11005	AIR 11011	AIR 11013	DIR 11011	AIR 11015						數量: 319																			
		17	24	24	24	24												18												
2F	SAIR 11002	SIDB 11003	SIDB 11004	DIR 11003	APB 11002	DIR 11003	AIR 11009						45																	
		16	22	16	15	21	24																							
	DIR 11004	DIR 11005	DIR 11006	DIR 11007	AIR 11006	AIR 11007	AIR 11008																							
		24	23	23	23	24	24	24			數量: 45												14							
1F	SAIR 11001	SIDB 11001	SIDB 11002	DIR 11001	DIR 11002	AIR 11003							55																	
		7	19	10	17	17	14																							
	DIR 11003	APB 11001	DIR 11002	DIR 11003	DIR 11002	DIR 11003	DIR 11020																							
		24	17	19	24	23	24	19																						
	AIR 11001	AIR 11002	AIR 11003	AIR 11004	AIR 11005						數量: 55												18							
		22	24	24	23	24																								
												總數	1300	770	622	351	351	37	73	73	70	23	41							
F區儀表		總數	到料	已完成																			拉線	配管	儀表安裝	導通&絕緣	絕緣			
		604	379	260																					0.81	0.88	0.43	0.30	0.36	

儀表安裝、配管工程

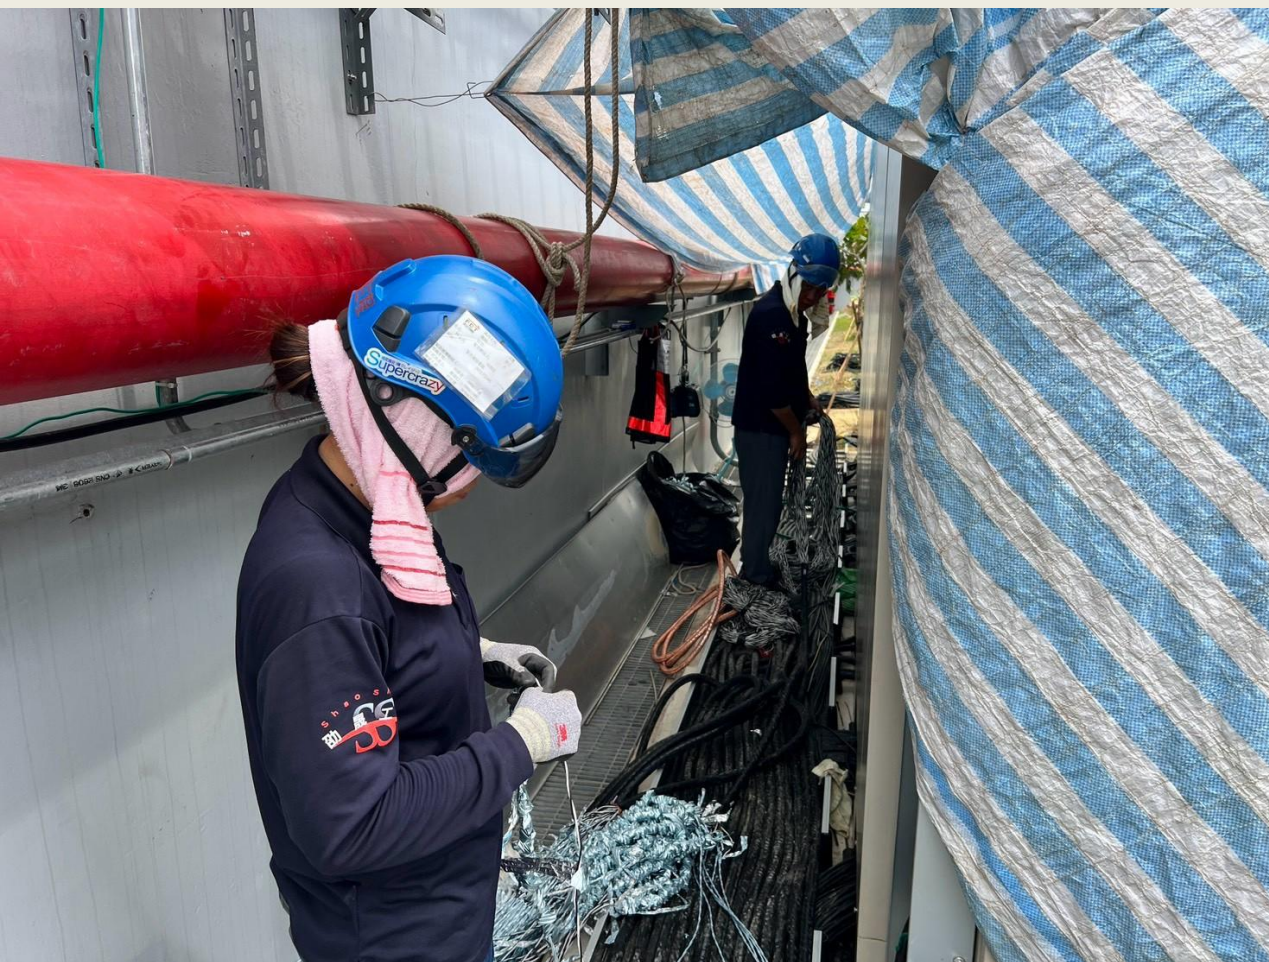

工程记录


拍摄时间: 2026.07.29 09:36

天气: 阴 28°C

地点: 觀音區·建國路145號

施工单位: 世新

儀表安裝、配管工程

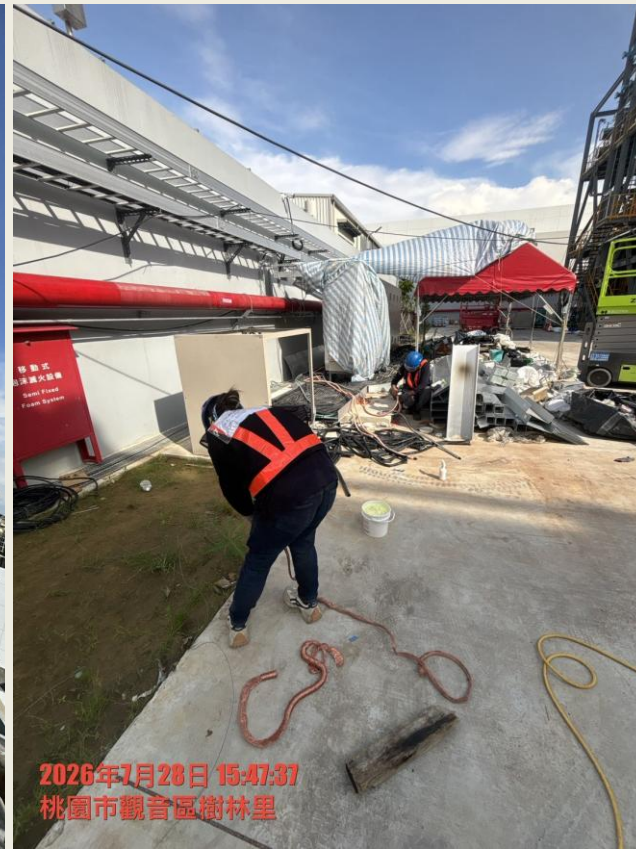

盛餘屏南 - 其民

- 工程事項：

1. 7/31 串列查核

- 追蹤事項：

1. 串列查核圖面修改（送電後）

兆豐銀行 - 其民

- 工程事項：

1. 7/28 協議組織會議
2. 7/28 土建隔熱磚 85%
3. 預計 8/7 物料吊掛改期

- 追蹤事項：

1. 8/12 ~ 8/14 吊掛與進場日期時間追蹤確認
2. 工班施工進場時間

兆豐銀行 - 宏明

■ 工程事項：

1. 支架組裝 25%：假固定

(立柱 100%、橫樑 100%、次樑 100%、斜撐100%、C 鋼100%)

2. 辛晴鋼構工班進場協調中，吊掛作業完成估價作業，吊掛作業期程協調中

(預計 8/12 ~ 8/14 執行)

3. 鋼構熱浸鍍鋅鏽點清查 161 處已協請其民課長協調，模組組裝鎖固後一併處理

■ 追蹤事項：

1. 防水施工完工，調整模組、儲能櫃進場吊掛正確時間，預計 8/12 ~ 8/14 (持續協調)

防水進度、吊掛協調

4:06

5G

< 99+ 振興兆...部 (19)

陳其民課長

估價單辛晴
(115072...修改.pdf)

下載期限：~ 8/5 16:31
檔案大小：117.9 kB

下午 4:31

陳其民課長

@Jet Chan 專案管理 這一份報價單是儲能櫃單獨吊運的費用

下午 4:32

陳其民課長

因逢典與土建的因素，原訂 8/7 吊掛往後延至 8/12-14 實際日期待逢典與土建確認有無其他工項影響
辛晴方面與吊車已通知

下午 4:34

Jet Chan 專案管理

陳其民課長 @Jet Chan 專案管理 這一份報價單是儲...

收到 謝謝

下午 4:47

+

📷

📎

Aa

😊

🎤

估價單辛晴 (115072701永盛鑫)-修改.pdf



完成

高雄市中華一路350號5F 804

TEL: 5527529 FAX: 5527083

報價單

尊戶:辛晴工程有限公司

ES. NO.曾小姐

日期: 115年 7月 27 日

貨 名 Description	工作時間	數量Quantity	單價 Unit price	總 價 Amount	備註 Remakes
吊車160噸(加副桿)	半天	1		40,000	
吊掛手-假日	一天	2		9,100	
吊掛手-平日	半天	2		4,000	
115072801			總 價	53,100	(未含稅)

台以八翁 - 宏明


- 追蹤事項：

1. 6/27案場漏水：防漏施工東側 $4 \times 9 = 36$ 片模組區塊下方，7/28發現漏水情事。

- 追蹤事項：

1. 案場漏水：工班進場安排中。

漏水協調處理



台積電 AP5B - 修原

■ 工程事項：

1. 線槽安裝 100%、線槽蓋 100%、通訊管 100%
2. DC 拉線 100%、AC 拉線 100%
3. DC MC4 結線 50%
4. AC、DC 主地線 100%
5. 逆變器掛設 100%

■ 追蹤事項：

1. 確認監控箱電源 220V
