

工程部週報

2026/07/20 ~ 2026/07/24



台以八翁 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 6/27 漏水：防漏施工東側 $4 \times 9 = 36$ 片模組區塊下方，巴威颱風過後堵漏區塊未發現漏水情事
2. 7/18 清洗水路 - 濾水桶漏水，維修廠商於 7/22 維修完成

- 追蹤事項：

1. 案場漏水：持續觀察中

接地測試箱鎖固、濾水桶漏水處理



良輝科技水電行

水世界生活館(<https://www.liang-buei.idv.tw>)

公司地址 高雄市橋頭區仕豐南路大同巷7號
郵遞區號 825

電話: 07-6112929 傳真: 07-6121497

報價單

日期 2026/7/20

客戶: 綠源科技股份有限公司 統一編號: 28696141
聯絡人: 洪麗二 0975221812

報價有效期至 2026/8/31

公司電話: 02-26416567 分機: 201
住址: 新北市汐止區大同路一段177號5樓(經緯中心A棟)

注意: 含5%的營業稅

商品	單價	數量	總計
A1型漏水維修	6000	1	\$6,000
5% 營業稅	\$300.00	1	\$300
不含施工			
合計			\$6,300

銀行帳號
215 花蓮第一信用合作社
0150 橋頭分社
帳號 15420000001674
戶名 良輝科技水電行
※請先轉帳後告知, 接洽聯絡人姓名手機

聯絡人陳先生: 0919437905



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

1. 支架組裝 25%：假固定

(立柱 100%、橫樑 100%、次樑 100%、斜撐100%、C 鋼100%)

2. 防水、高壓磚鋪設施工 70%，預計 7/27 完成鋪設，鋼構工班進場協調中，

吊掛作業 7/22 場勘完成目前進行估價作業

3. 鋼構熱浸鍍鋅鏽點清查 161 處已協請其民課長協調，模組組裝鎖固後一併處理

兆豐銀行 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 防水工程進度 - 防水施工預計完工時間 **7 月底**，調整模組、儲能櫃進場吊掛
正確時間預計 **8 月初**（持續追蹤）

防水進度

7/20屋頂隔熱磚施工現況(4/48)

陳其民課長

2026.7.20 下午 5:10



法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 87%

拉線進度 54%

絕緣導通測試 30%

儀表安裝 38%

儀表結線 36%

總進度 81.1%

案場協調項目：其餘工項暫緩先以 1、2 F 一二次側配管為主，目標配管拉線 8/31 完成

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無



施工進度表

五 JB箱至PLC拉設									
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	190	2026/1/20	2026/7/28	83%
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	99%	150	2026/3/3	2026/7/30	83%
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	97%	130	2026/3/23	2026/7/30	75%
六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	92%	120	2026/4/12	2026/8/9	87%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	66%	150	2026/4/23	2026/9/19	54%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	0%	20	2026/7/1	2026/7/20	30%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	50%	120	2026/5/28	2026/9/24	38%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	16%	80	2026/7/10	2026/9/27	16%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	36%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343			81.6%	343			81.1%



										二次側					盤數	一次側														
										點位	配管	配線	導通&絕緣	箱體結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線										
6F	SAIR 11004	AIB 11002	DB 11019	UB 11000							數量：37	37	37	37	37		4	4	4	4										
		24	10	3												4														
5F	SAIR 11005	DB 11007	UB 11009	AIB 11009	AIB 11021	AIB 11020	DB 11018				數量：115	115	115	115			7	7	7	7										
		14	15	24	23	24	15									7														
4F	SIDB 11006	DB 11015	APB 11004	AIB 11007	UB 11008	DB 11014						199	199	199	199		12	12	12	12										
	8	20	9	24	18	17																								
	DB 11013	AIB 11016	UB 11007	AIB 11018	DB 11016																									
	20	24	15	24	20				數量：199																					
3F	SIDB 11005	AIB 11012	APB 11003	DB 11004	DB 11009	UB 11006						319	271				18	18		18										
	17	23	14	12	18	12																								
	DB 11010	AIB 11010	UB 11004	DB 11008	DB 11012	AIB 11014																								
	17	24	11	19	15	24																								
	UB 11005	AIB 11011	AIB 11013	DB 11011	AIB 11015																									
	17	24	24	24	24				數量：319						18															
2F	SAIR 11007	SIDB 11003	SIDB 11004	DB 11003	APB 11002	UB 11003	AIB 11009					16					14													
		16	22	16	15	21	24																							
	DB 11004	DB 11005	DB 11006	DB 11007	AIB 11006	AIB 11007	AIB 11008																							
	24	23	23	23	24	24	24		數量：279						14															
1F	SAIR 11001	SIDB 11001	SIDB 11002	UB 11001	UB 11002	AIB 11013						55					18													
	7	19	10	17	17	14																								
	DB 11013	APB 11001	DB 11002	DB 11001	DB 11002	DB 11003	DB 11020																							
	24	17	19	24	23	24	19																							
	AIB 11001	AIB 11002	AIB 11003	AIB 11004	AIB 11005				數量：351						18															
	22	24	24	23	24																									
										總數	1300	741	622	351	351	37	73	73	41	23	41									
F區儀表										總數	到料	已完成														拉線	配管	儀錶安裝	導通&絕緣	結線
										604	379	232														0.54	0.87	0.38	0.30	0.36

儀表安裝、配管工程

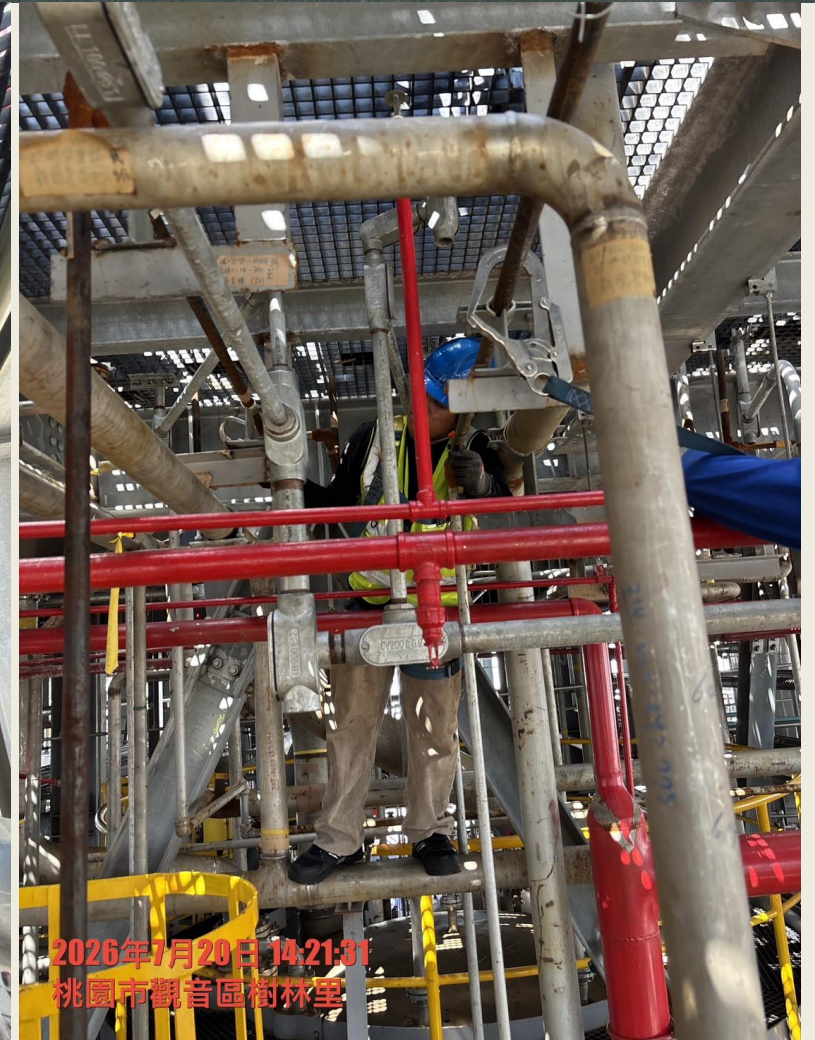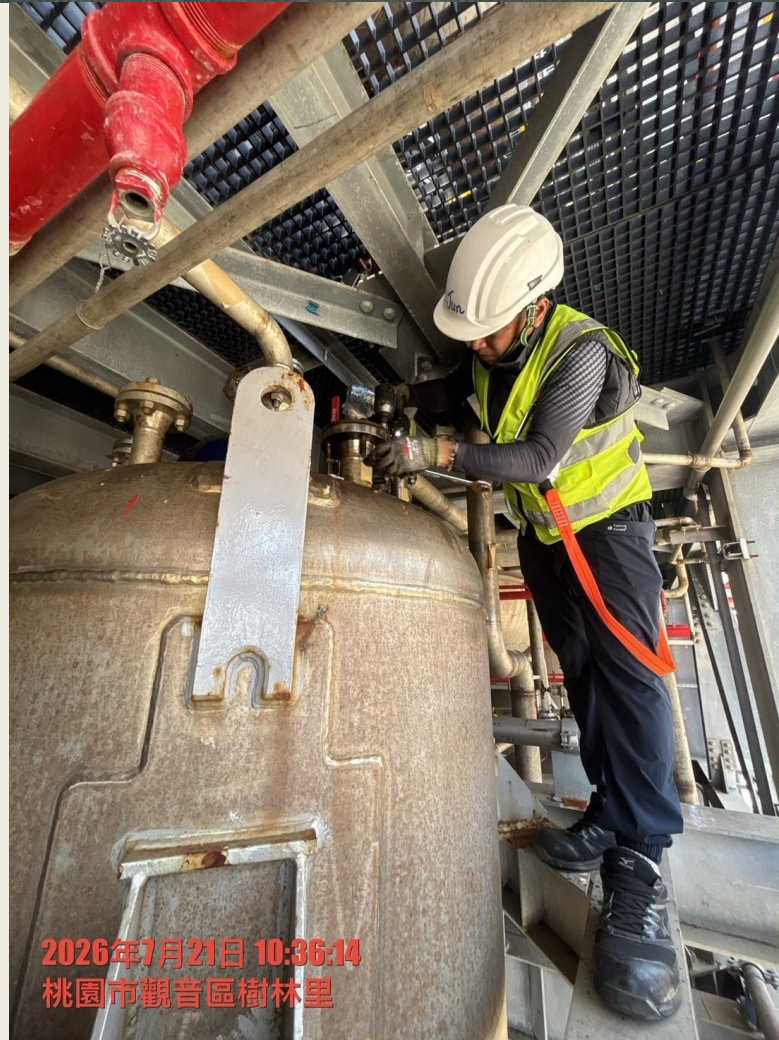

儀表安裝、配管工程



台積電 AP5B - 修原

- 工程事項：

1. 線槽安裝 (AC 100%、DC 100%)
2. 電氣室開孔 100%
3. 金屬軟管安裝開孔 (100% 預置完成)
4. 逆變器電壓值更正設定 (已重新設置 380V > 480V)
5. 拉 DC 線 10%
6. 竣工資料整理

- 追蹤事項：追蹤友達外部廠商協助進場設定

台積電 AP7 - 其民

- 工程事項：

1. 7/21 喜利得錨栓植筋課程與高信支撐架課程
2. 7/22 與土建 AP7 移交基礎座（部分墩座未全部完成，缺失部分記錄於報告）

- 追蹤事項：

1. 物料進場前置作業
2. 人員進場時間

AP7 20260722 水泥墩座進度查驗



高壓磚鋪設中



地面防水完成




墩座防水完成




歪斜不整齊



尚未澆灌

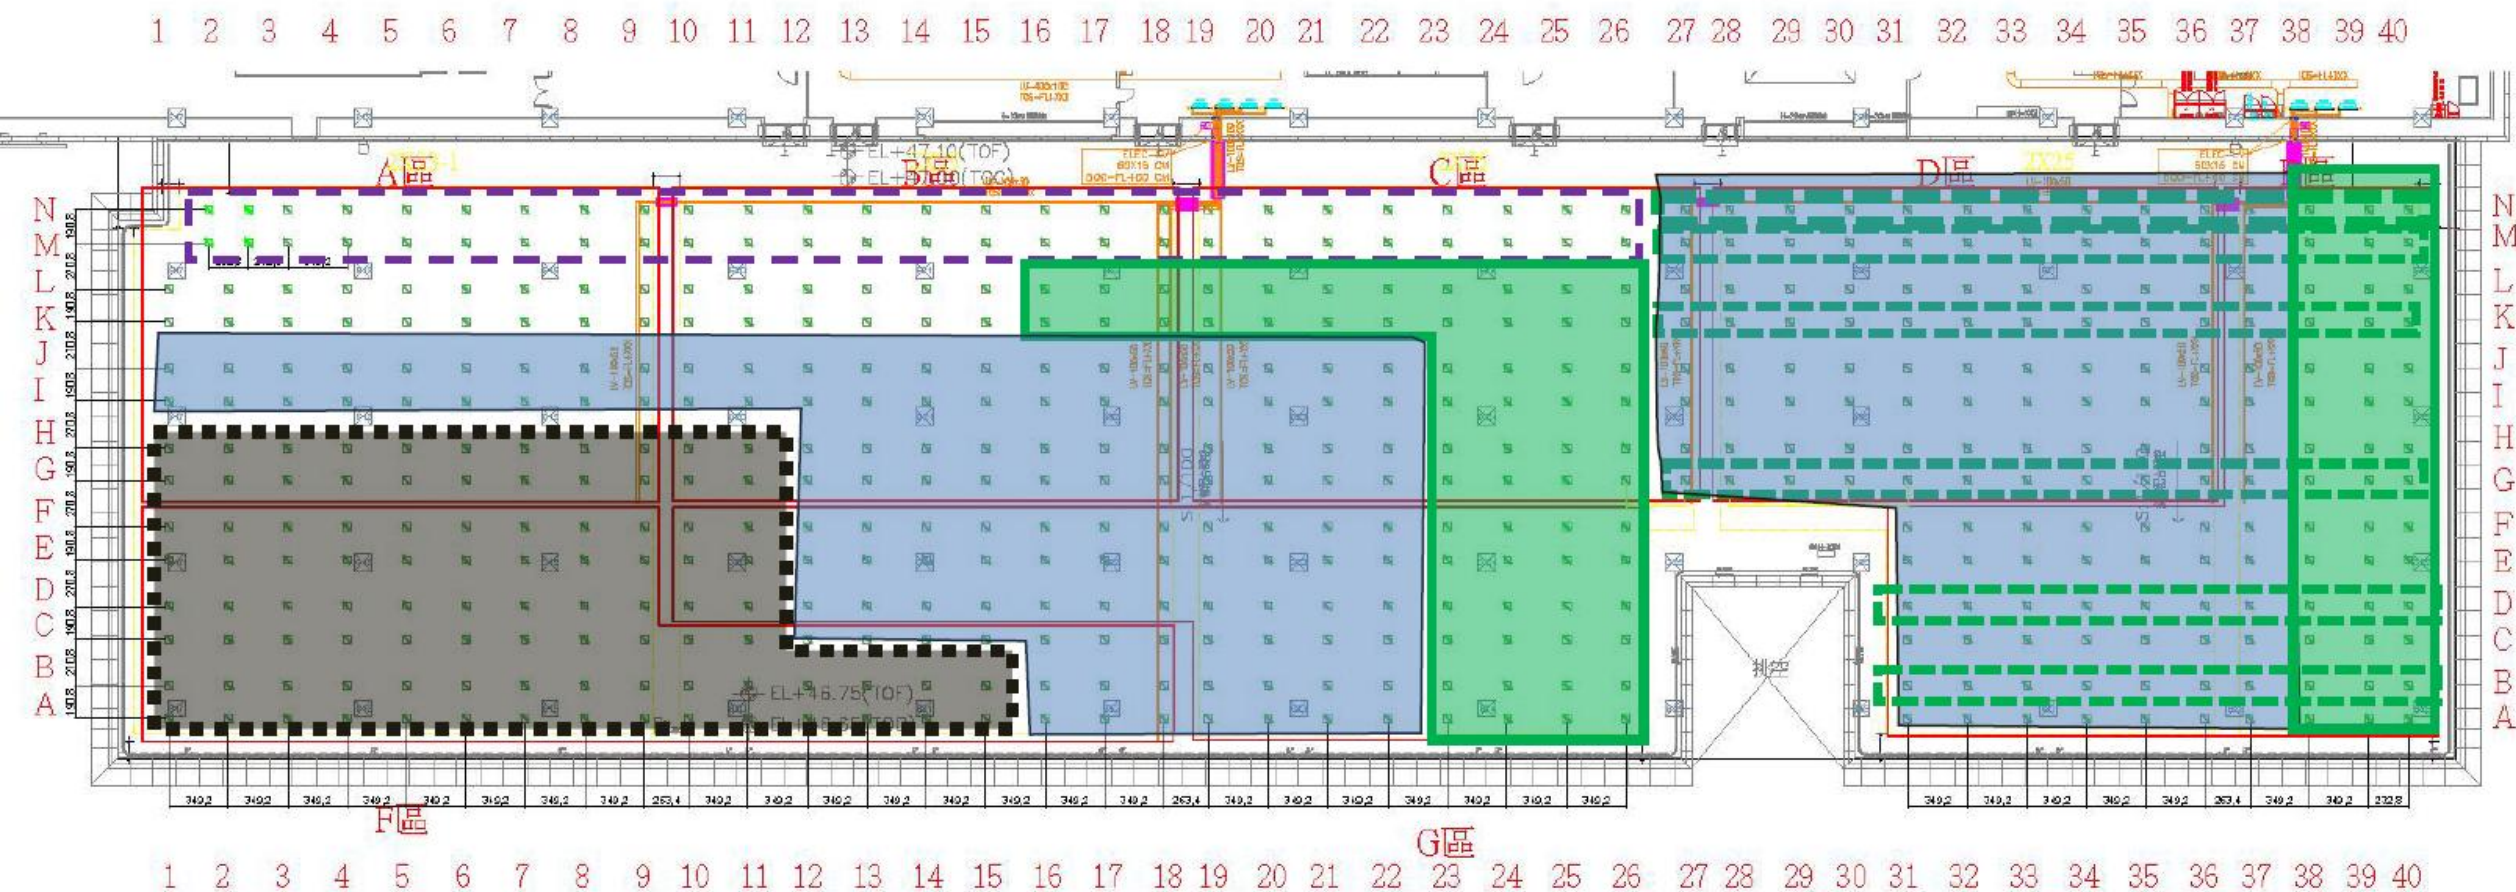


AP7 20260722 歪斜陣列表量測

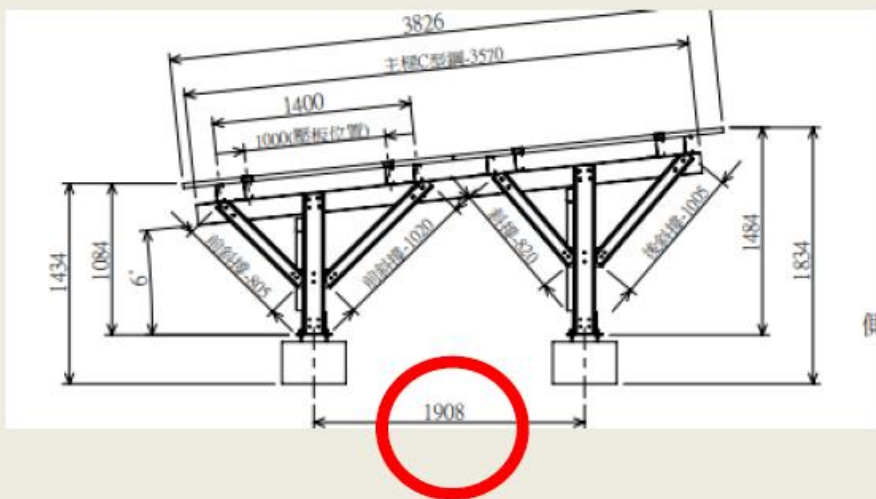

支架前後兩柱為一組,兩墩座間距標準為190.8cm

現場已完成水泥墩座肉眼可見歪斜,實際量測數值為紅框內數值(cm),此為土建施工,作為備註,以防後續責任問題

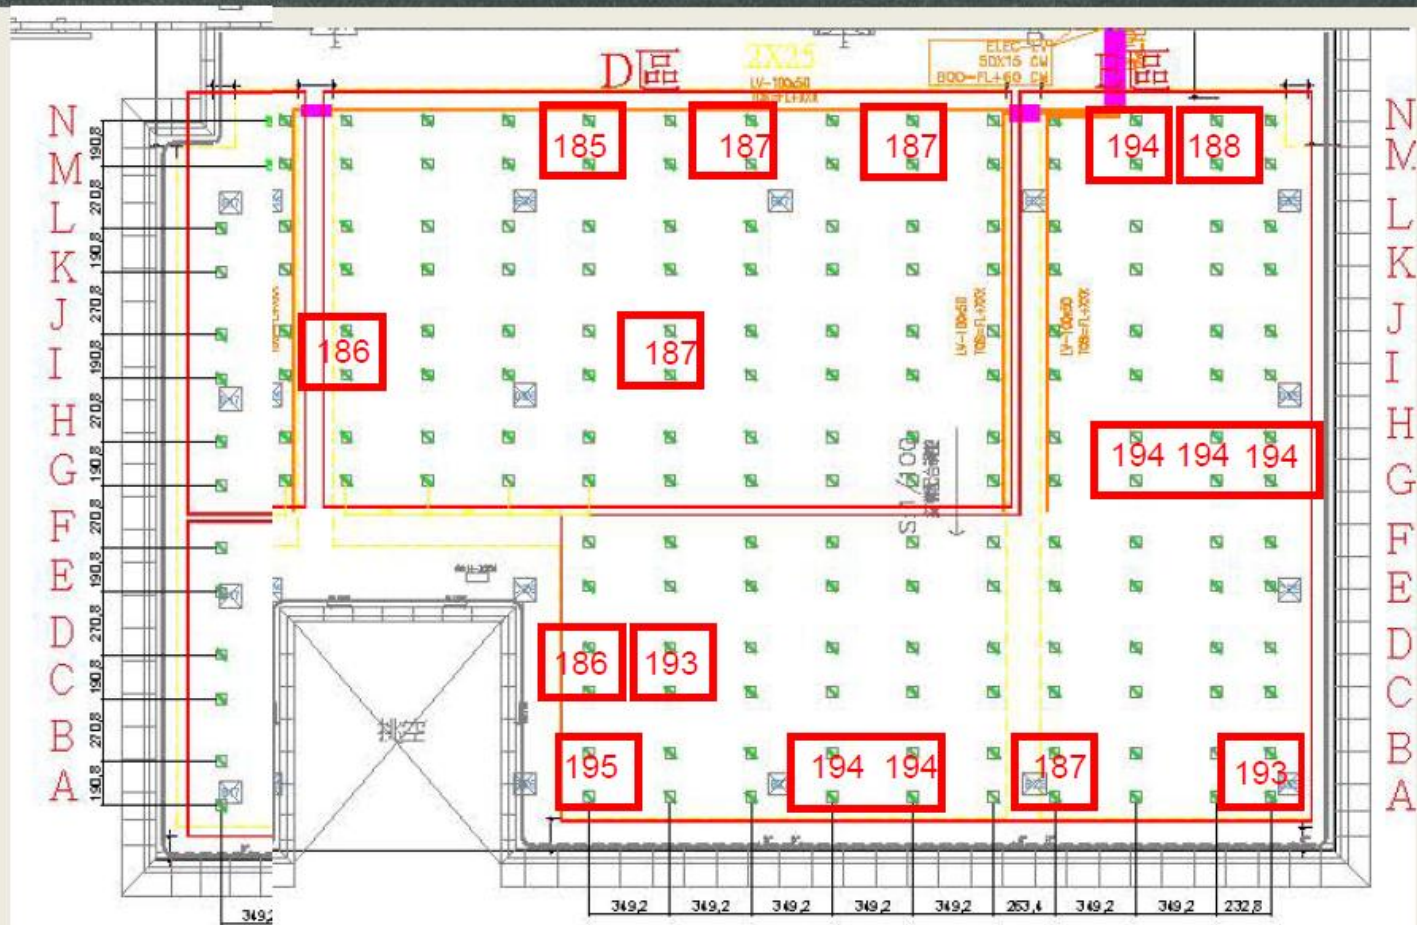

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

盛餘屏南 - 其民

- 工程事項：

1. 7/22 監控斷線查修 (INV D8 ~ E8 共 13 台斷線)

- 追蹤事項：

1. 7/24 小港看板修改文字配置
2. 串列查核圖面修改 (送電後)

兆豐銀行 - 其民

■ 工程事項：

1. 7/21 施工示意撰寫並給逢典
2. 土建隔熱磚筋度追蹤 (預計 8/31 完成)
3. 7/23 吊車司機現場勘查

■ 追蹤事項：

1. 8/8 模組與儲能櫃進場協調追蹤確認
2. 工班施工進場時間

160噸吊車位置

模組與吊上放置區

吊掛暫置區域


儲能櫃

預計16棧板太陽能模組
(200cm*150cm*130cm重量
約700kg)

儲能櫃160cm*140cm*280cm
，重量約2700KG


其他零散配件打包重量與尺寸
不超過上述兩者

堆高機下貨於暫置區域
後吊上
預計時間為四小時

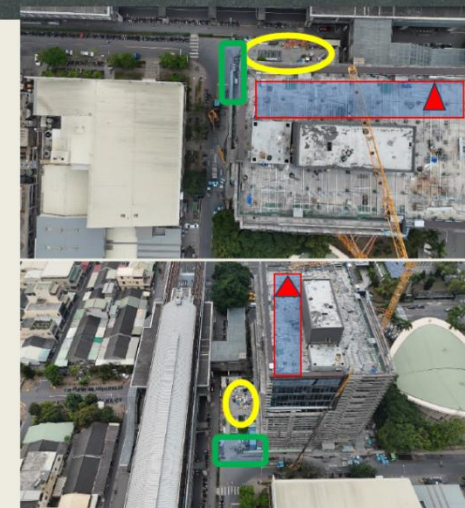

現場須預先整理事項

1.吊車停放與施工區域
需清理空間方便作業

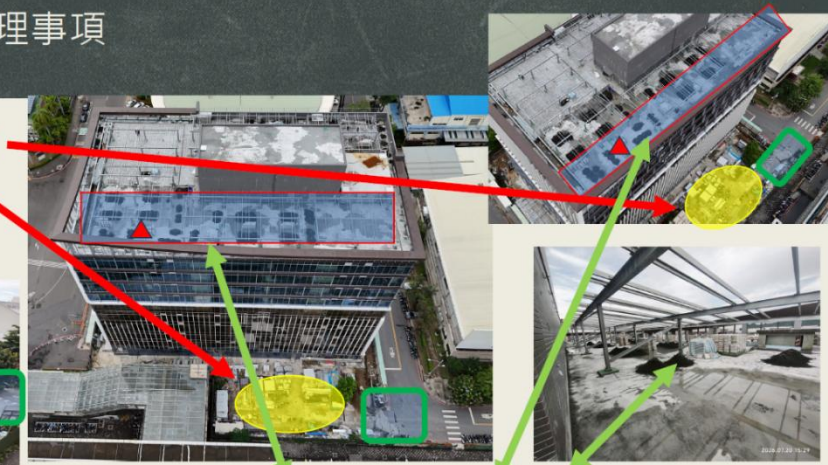

2.屋頂隔熱磚施工完畢(預計14天工期不考慮天候因素)後
才可吊上並放置太陽能板
