

工程部週報

2026/07/20 ~ 2026/07/24



台以八翁 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 6/27 漏水：防漏施工東側 $4 \times 9 = 36$ 片模組區塊下方，巴威颱風過後堵漏區塊未發現漏水情事
2. 7/18 清洗水路 - 濾水桶漏水，維修廠商於 7/22 維修完成

- 追蹤事項：

1. 案場漏水：持續觀察中

接地測試箱鎖固、濾水桶漏水處理



良輝科技水電行

水世界生活館(<https://www.liang-buei.idv.tw>)

公司地址 高雄市橋頭區仕豐南路大同巷7號
郵遞區號 825

電話: 07-6112929 傳真: 07-6121497

報價單

日期 2026/7/20

客戶: 綠源科技股份有限公司 統一編號: 28696141
聯絡人: 洪麗二 0975221812

報價有效期至 2026/8/31

公司電話: 02-26416567 分機: 201
住址: 新北市汐止區大同路一段177號5樓(經緯中心A棟)

注意: 含5%的營業稅

商品	單價	數量	總計
A1型漏水維修	6000	1	\$6,000
5% 營業稅	\$300.00	1	\$300
不含施工			
合計			\$6,300

銀行帳號
215 花蓮第一信用合作社
0150 橋頭分社
帳號 15420000001674
戶名 良輝科技水電行
※請先轉帳後告知, 接洽聯絡人姓名手機

聯絡人陳先生: 0919437905



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

1. 支架組裝 25%：假固定

(立柱 100%、橫樑 100%、次樑 100%、斜撐100%、C 鋼100%)

2. 防水、高壓磚鋪設施工 70%，預計 7/27 完成鋪設，鋼構工班進場協調中，

吊掛作業 7/22 場勘完成目前進行估價作業

3. 鋼構熱浸鍍鋅鏽點清查 161 處已協請其民課長協調，模組組裝鎖固後一併處理

兆豐銀行 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 防水工程進度 - 防水施工預計完工時間 **7 月底**，調整模組、儲能櫃進場吊掛
正確時間預計 **8 月初**（持續追蹤）

防水進度

7/20屋頂隔熱磚施工現況(4/48)

陳其民課長

2026.7.20 下午 5:10



法蘭摩沙 - 鎮寶

F 區配管進度 87%

拉線進度 54%

絕緣導通測試 30%

儀表安裝 38%

儀表結線 36%

總進度 81.1%

案場協調項目：其餘工項暫緩先以 1、2 F 一二次側配管為主，目標配管拉線 8/31 完成

公司部門協調項目：無

窒礙難行項目：無



施工進度表

五 JB箱至PLC拉設									
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	190	2026/1/20	2026/7/28	83%
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	99%	150	2026/3/3	2026/7/30	83%
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	97%	130	2026/3/23	2026/7/30	75%
六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	92%	120	2026/4/12	2026/8/9	87%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	66%	150	2026/4/23	2026/9/19	54%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	0%	20	2026/7/1	2026/7/20	30%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	50%	120	2026/5/28	2026/9/24	38%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	16%	80	2026/7/10	2026/9/27	16%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	0%	60	2026/7/1	2026/8/29	36%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	0%	15	2026/8/29	2026/9/12	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	0%	30	2026/10/1	2026/10/30	0%
		343			81.6%	343			81.1%



										二次側					盤數	一次側														
										點位	配管	配線	導通&絕緣	箱體結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線										
6F	SA/B 11004	A/B 11002	D/B 11019	D/B 11000							數量：37	37	37	37	37		4	4	4	4										
		24	10	3												4														
5F	SA/B 11005	D/B 11007	D/B 11009	A/B 11009	A/B 11021	A/B 11020	D/B 11018				數量：115	115	115	115			7	7	7	7										
		14	15	24	23	24	15									7														
4F	SD/B 11006	D/B 11015	A/B 11004	A/B 11007	D/B 11008	D/B 11014																								
	8	20	9	24	18	17						199	199	199	199			12	12	12	12									
	D/B 11013	A/B 11016	D/B 11007	A/B 11018	D/B 11016																									
	20	24	15	24	20					數量：199						12														
3F	SD/B 11005	A/B 11012	A/B 11003	D/B 11004	D/B 11009	D/B 11006																								
	17	23	14	12	18	12						319	271					18	18		18									
	D/B 11010	A/B 11010	D/B 11004	D/B 11008	D/B 11012	A/B 11014																								
	17	24	11	19	15	24																								
	D/B 11005	A/B 11011	A/B 11013	D/B 11011	A/B 11015																									
2F		17	24	24	24	24				數量：319						18														
	SA/B 11007	SD/B 11003	SD/B 11004	D/B 11003	A/B 11002	D/B 11003	A/B 11009																							
		16	22	16	15	21	24					16						14												
	D/B 11004	D/B 11005	D/B 11006	D/B 11007	A/B 11006	A/B 11007	A/B 11008																							
1F		24	23	23	23	24	24	24	數量：279							14														
	SA/B 11001	SD/B 11001	SD/B 11002	D/B 11001	D/B 11002	A/B 11003																								
	7	19	10	17	17	14																								
	D/B 11001	A/B 11001	D/B 11002	D/B 11001	D/B 11002	D/B 11003	D/B 11020					55						18												
	24	17	19	24	23	24	19																							
	A/B 11001	A/B 11002	A/B 11003	A/B 11004	A/B 11005				數量：351							18														
	22	24	24	23	24																									
										總數	1300	741	622	351	351	37	73	73	41	23	41									
F區儀表										總數	到料	已完成																		
										604	379	232																		

儀表安裝、配管工程

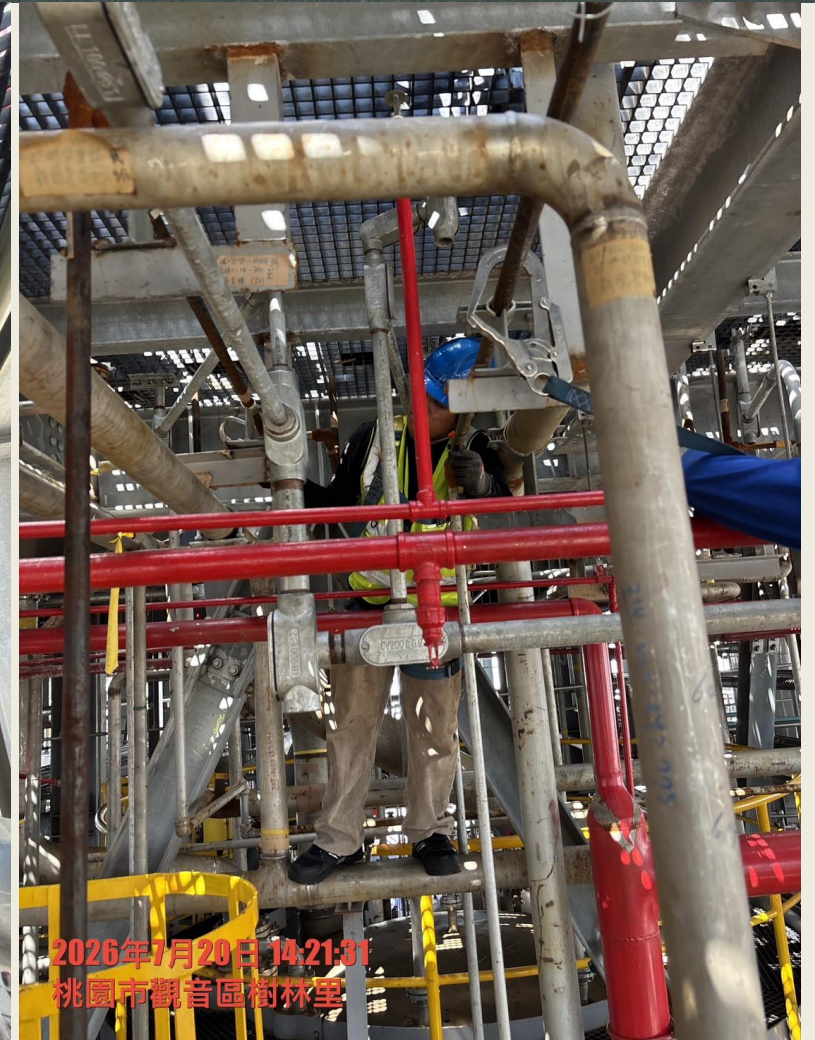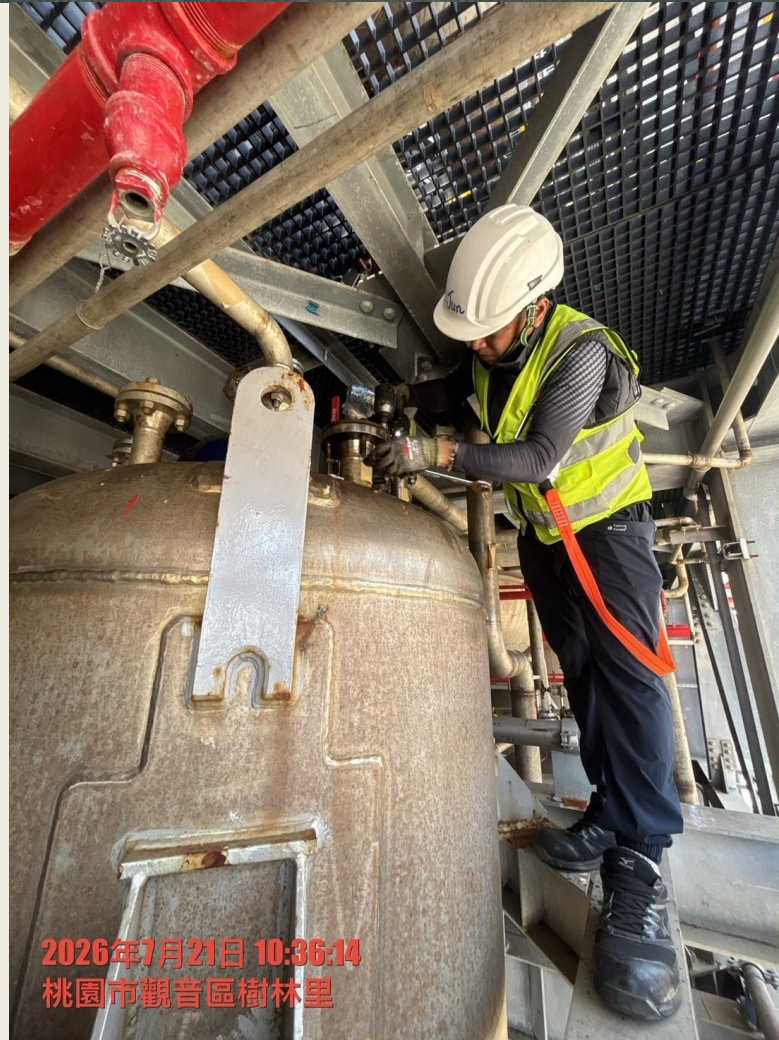

儀表安裝、配管工程

