

工程部週報

2026/06/15 ~ 2026/06/18



台積電 AP7

- 工程事項：

1. 6/17 完成水泥墩座查驗
2. 6/18 墩座查驗報告撰寫

- 追蹤事項

1. 下包商人選
2. 高信與土建部分就施工區域與其他平行包干涉釐清
3. 維運同仁（有類似經驗）建議直接施工只要墩座都完成直接上拍照記錄，
做為責任釐清（不管其他廠商工項）

盛餘屏南

- 工程事項：

1. 6/12 流動廁所、剩餘物料運回大寮
2. 6/18 盛餘維運部門要求於現場開會（針對現場與圖面不符部分查驗）

- 待辦事項

1. 6/24 ~ 6/25 預計清洗
2. 6/24 ~ 6/25 送電前檢測與串列檢查（盤體內接點、清潔）
3. 6/22 盛餘上課（入場要求）
4. 現場與圖面不符合部分改善（改圖或現場增加標示）

精湛

- 工程事項

1. 6/16、6/17 維運交接與監控線路修復（目前已系統上線正常運轉）


亨叡

- 工程事項

1. 7/1 外線施工

法蘭摩沙 - RIO 區工程

- 各盤施工進度及工項
- F1UTIL-PR-01-A I/O盤 100%
- F1UTIL-PR-01-D I/O盤 100%
- F1UTIL-PR-02盤 100%
- F1UTIL-TNK-A I/O盤 100%
- F1UTIL-TNK盤 100%
- SIJB (SIS數位DO) 盤 * 2
- 新增24P控制線路 100%

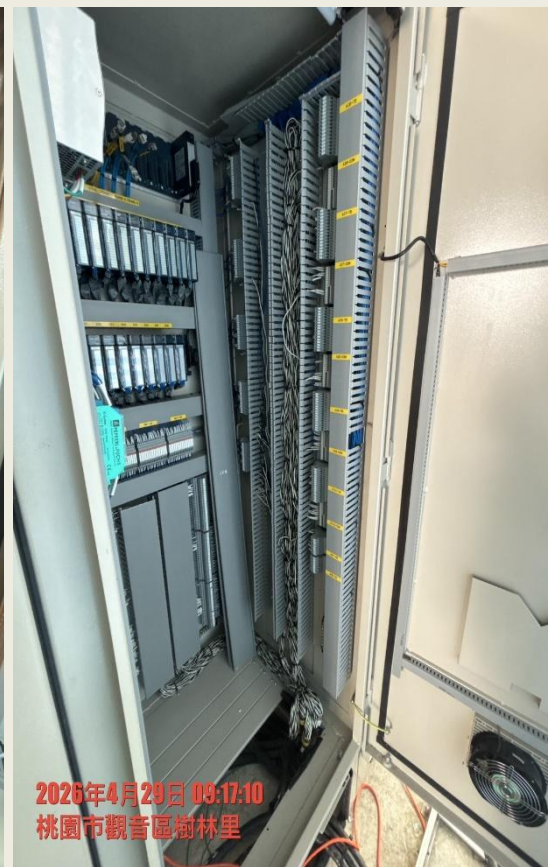

光纖工程

環場光纖

L 區 OK


D 區 OK

B 區 OK

RIO 區預計 5/30 光纖熔接



B 棟電氣室工程

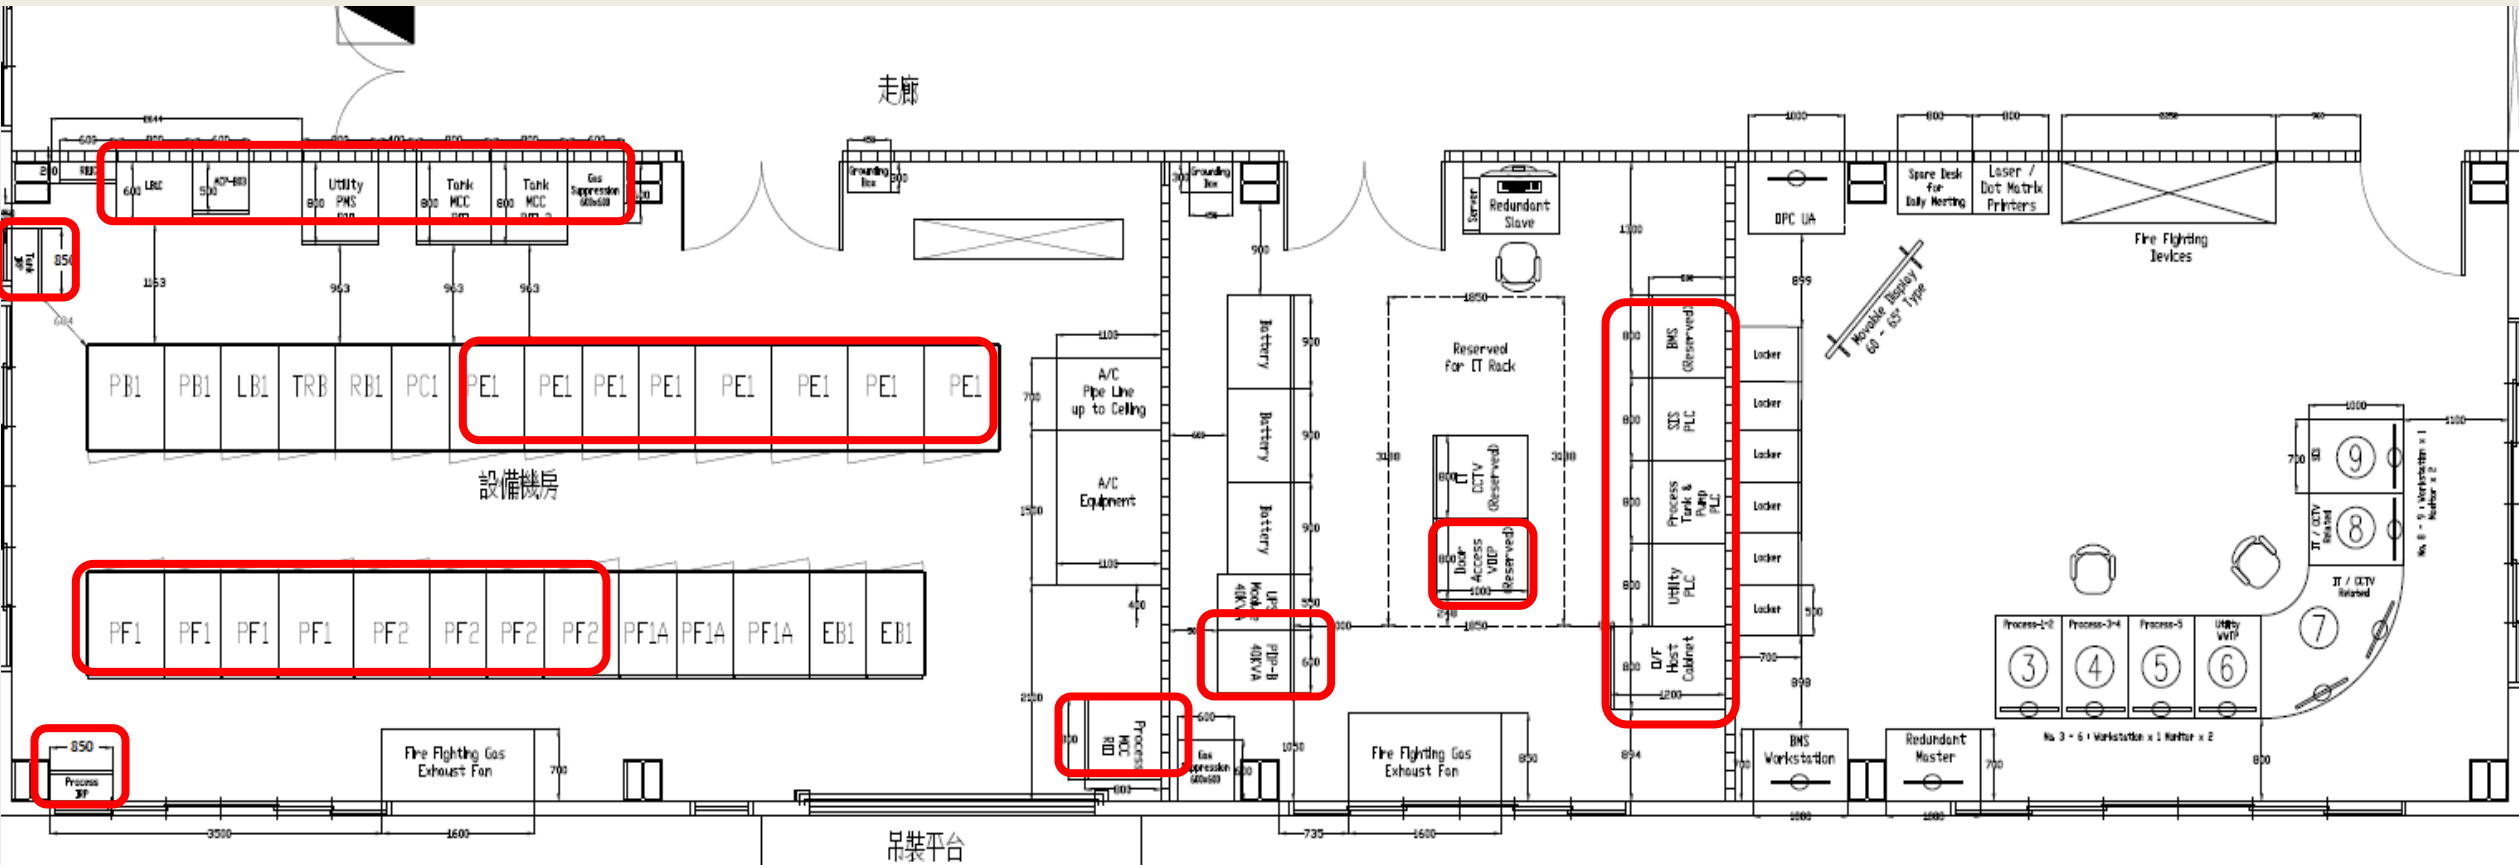

B 棟電氣室工程 - B 區各工項 已驗收完畢

- PDP-B (UPS 電源總盤) 至 9 個控制盤電源線
- Tank-MCC 盤至 IRP 盤 38 組控制電源
- Tank-MCC , Proess-MCC 盤至 PE 盤 90 組控制線路
- Proess-MCC 盤至 IRP 盤 52 組控制電源
- Tank-MCC 盤至 IRP 盤 4 條 24P 控制電源
- Proess-MCC 盤至 IRP 盤 5 條 24P 控制電源
- 4/6 增加 PR-IRP 盤至 RIO SIS 盤 4 條 24P 控制電源
- 4/6 增加 TANK-IRP 盤至 RIO SIS 盤 3 條 24P 控制電源
- 4/24 ~ 4/26 導通絕緣自檢、盤體清潔

追加管制工項

3/17 追加管制項目：


- F 區 5F (餘設備結線) < ~ > L 棟 (已完成) (24P * 3 條 , 1T * 9 條)
- D 棟 PLC 盤 < ~ > L 棟三浦 PLC (1P * 2 條) (已完成)
- O 區 < ~ > E 區 DPJB 盤顯示器電源 (DC 24V * 1 (餘結線) , CAT6 * 2 (已完成))
- O 區 < ~ > RIO IPJB - 靜電裝置 (220V 2 / C 3.5mm² * 1) (已完成)
- F 區 APJB / DPJB 一次側到 RIO PDP-S (2 / C 及 3 / C 交直流 30mm²) (已完成)
- I 區北側 ACP-C / ACP-1 到 RIO PDP-S (2 / C 14mm² * 2) (已完成)
- I 區 LU , LF / LCP-1 到 RIO PDP-S (2 / C 14mm² * 2) (已完成)

追加管制工項


5/18 追加管制項目：

- C 區 / I 區至 P 區臨時盤、臨時電纜線路及開關移除 (已完成)
- B 區 IRP 盤至 RIO 24P * 7 電纜 (已完成)
- L 區 PJB 盤 (已完成) 至 F 區五樓儀表及 DJB 及 AJB 箱體 1T * 9 24P * 3 電纜 (已拉至定位餘結線)
- RIO 區 PDP-S 盤至分盤電源 (12.13.14 NFB) 2 / C 3.5mm² (已完成)
- RIO 區至五樓 (製程區泵浦配電盤 RS485 通訊) (已完成)
- B 區電氣室各盤體封板 (工班尚未安排)
- E 區接地電纜重新連接 (完成進度 40%)
- L 區 1 樓、3 樓 LEL 盤體至 L 區二樓 PDP-L 盤電源線 (工班尚未安排)
- L 區 1 樓發電機盤體至油箱，拉設控制線 (線材亞通備料) (已完成)

工區圖

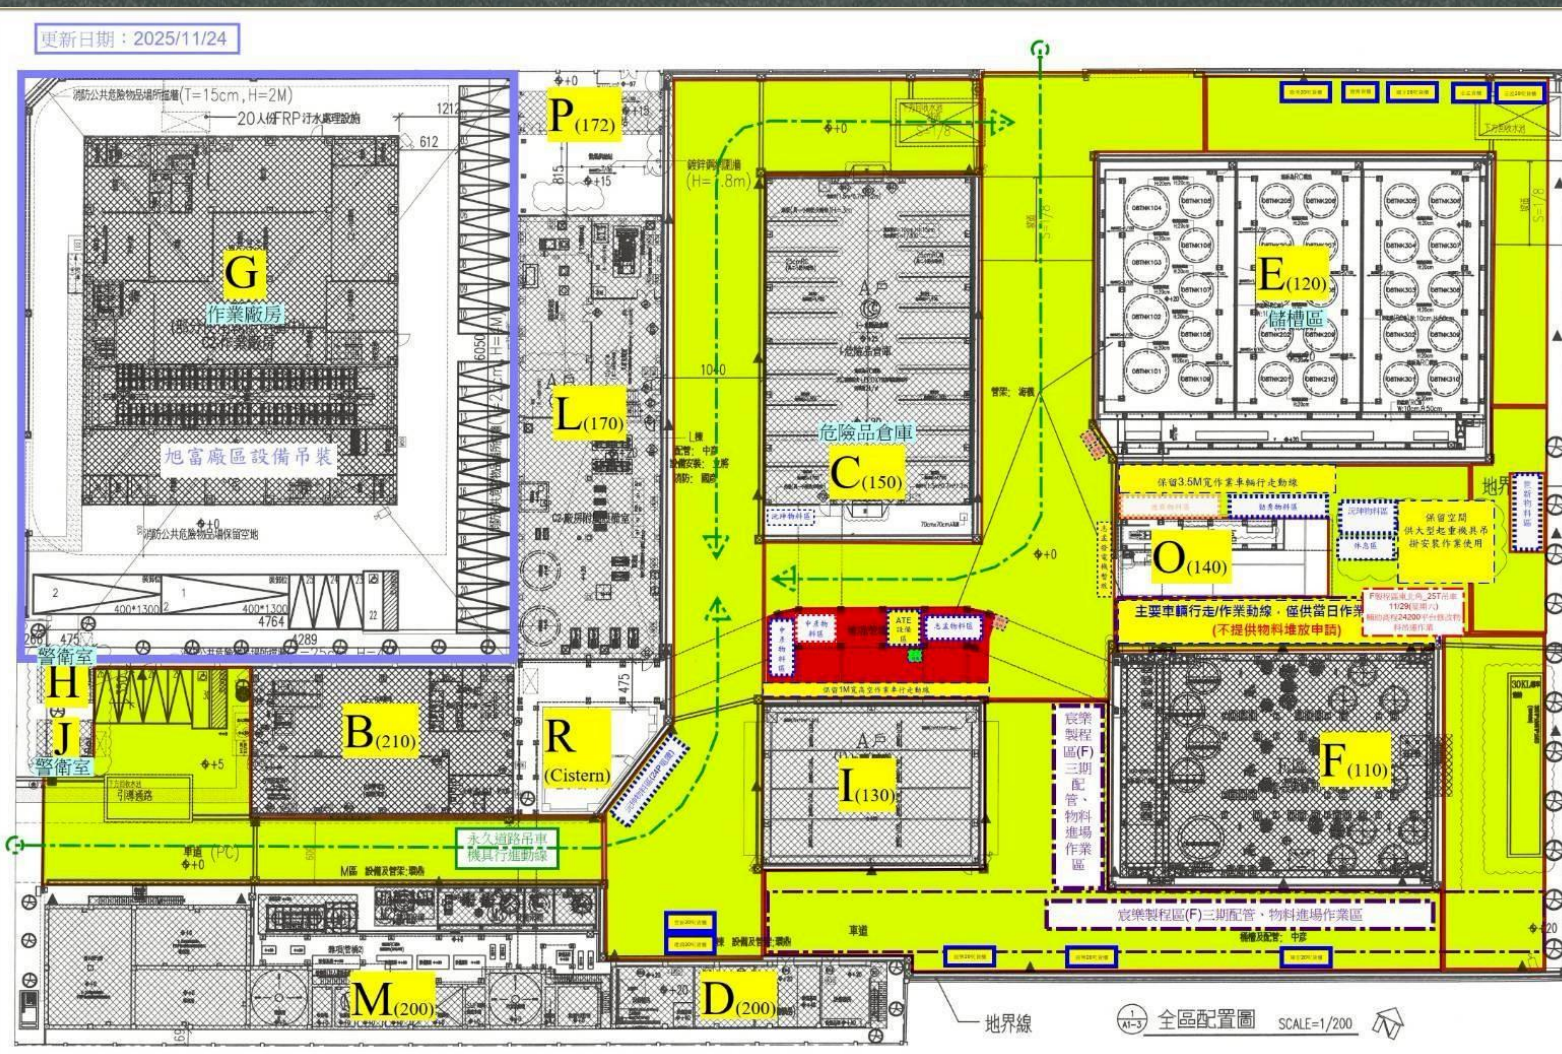

F區立面圖

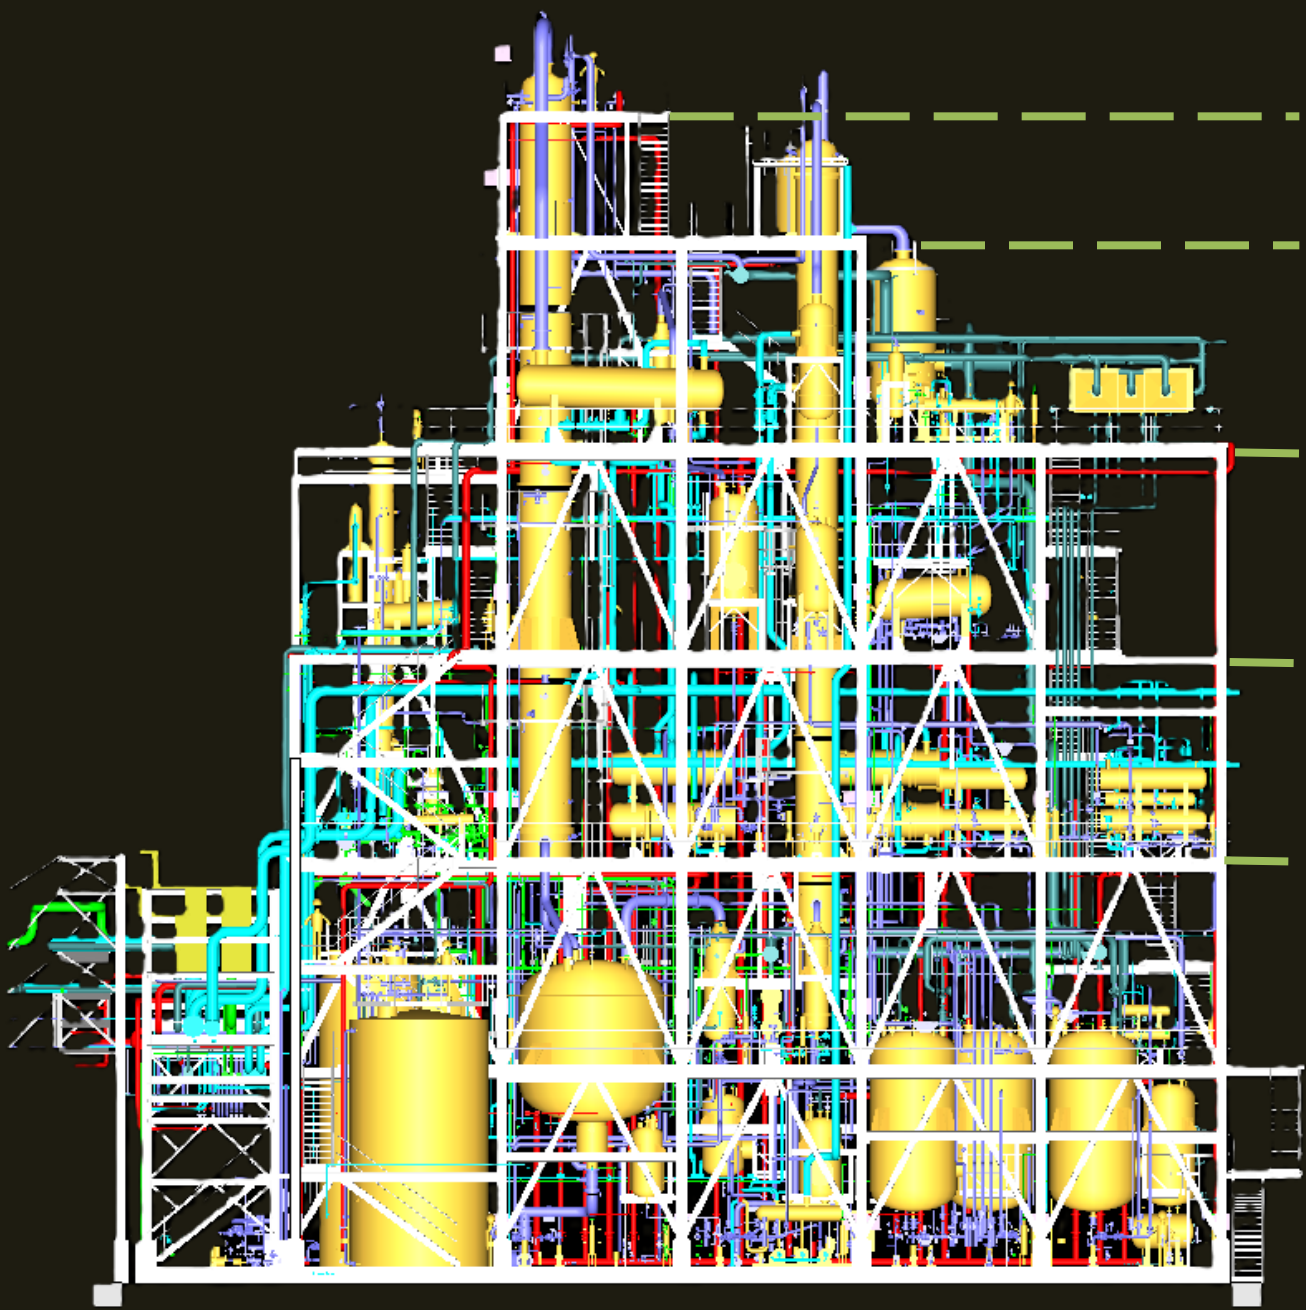

7F 儀表安裝

6F

5F

4F

3F 二次側配管

2F

1F

一、二次側
拉線配管完成

F 區 3 樓二次側配管工程 (3F 以下製程管部分尚未完成)

查驗追蹤事項：

一次側施工查驗電纜 & 導通及絕緣測試

- E 區導通絕緣 100% (業主抽測)
- I 區導通絕緣 100% (業主抽測)
- O 區導通絕緣 100% (業主抽測)
- F 區導通絕緣 100% (業主抽測)
- B 區導通絕緣 100% (業主抽測)

二次側施工查驗電纜 & 導通及絕緣測試

- I 區導通絕緣 100%
- O 區導通絕緣 100%
- F 區導通絕緣 0%

各區儀表安裝情形

- I 區儀表安裝 100% (業主抽測)
- O 區儀表安裝 100% (業主抽測)
- F 區儀表安裝 17.5%

I、O、E、F 區 施工進度及工項

■ I區

箱體 1 次側進度 100%
箱體 2 次側進度 100%
(儀表安裝完成)

■ O區

箱體 1 次側進度 100%
箱體 2 次側進度 95%
(儀表安裝完成)

■ E區

箱體 1 次側進度 100%
箱體 2 次側進度 90%
(AP、DP 電源箱體尚未結線)

■ F區

1F :
箱體安裝進度 100%
箱體 1 次側進度 0%
箱體 2 次側進度 0%

2F :
箱體安裝進度 100%
箱體 1 次側進度 0%
箱體 2 次側進度 0%

3F :
箱體安裝進度 100%
箱體 1 次側進度 70%
箱體 2 次側進度 50%

(製程管部分尚未安裝完成)

4F :
箱體安裝進度 100%
箱體 1 次側進度 100%
箱體 2 次側進度 60%

5F :
箱體安裝進度 100%
箱體 1 次側進度 100%
箱體 2 次側進度 65%

6F :
箱體安裝進度 100%
箱體 1 次側進度 100%
箱體 2 次側進度 70%
