綠源科技股份有限公司
Green Source Technology

工程部週報

2026/10/12 ~ 2026/10/16



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

1. 支架組裝 86%
2. 模組安裝 85.2%
3. 變流器安裝 100%
4. 儲能櫃安裝 90%
5. 直流線路架設 97%
6. 箱體施工 - ACP、監控箱安裝鎖固 65%
7. 交流線路施工 68%

兆豐銀行 - 宏明

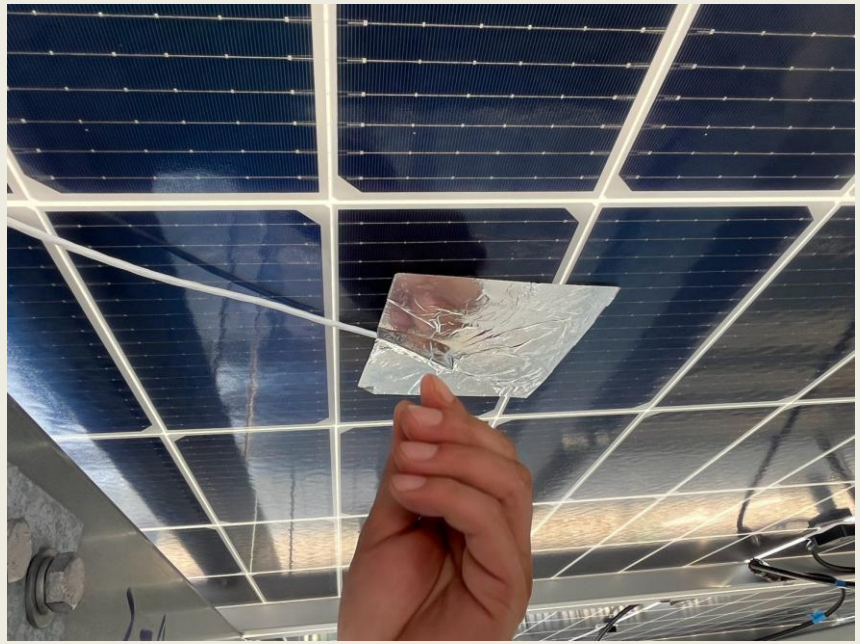
- 追蹤事項：

追蹤後續 AC 盤體內部配件...等物料進場及鋼構施工人員進場

1. 變流器壓克力牌 - 辛晴
2. 鋼構 - 鏽點補高鋅漆、鎖固、定磅、畫線標 - 辛晴
3. ACP 箱體內配件（CT）到貨時間 - 採購
4. SUN～ACP 配線及模組獨立接地及 SUN～監控相 220V 完成時間 - 夆典
5. 收縮水泥證明單用印 - 辛晴

監控箱







未完成項目	執行單位	備註
220V 電源線	傘典	10/13 通知人維
網路線	傘典	10/13 通知人維

ACP箱體





未完成項目	執行單位	備註
ACP～SUN 電源線	傘典	10/13 通知人維
CT	採購	9/30 說等 3 個月
台電掛表	台電	?

未完成項目

未完成項目	執行單位	備註
ACP～SUN 電源線	夆典	10/13 通知人維
CT	採購	9/30 說等 3 個月
台電掛表	台電	等業務通知
變流器壓克力牌	辛晴	9/14 通知曾老闆 10/13 工班阿龍
接地測試箱	夆典	10/13 通知人維
無收縮水泥證明單	辛晴	9/29 通知曾老闆
監控螢幕安裝	辛晴	10/14 人維：大樓台電 AC 電供電再裝
模組獨立接地	辛晴	等接地測試箱完成
SUN～監控相 220V	夆典	10/13 通知人維
鋼構 - 鏽點補高鋅漆、鎖固、定磅、畫線標	辛晴	8/21 通知曾老闆

台以八翁 - 宏明

- 工程事項：

1. 綠憑審查

- 追蹤事項：

1. 提報、施工工法及工序建議，內部審核中（第50天）
2. 8/25 漏水

綠憑審查

- 2026/10/15 綠憑審查

1. 電錶 30 倍審查單寫 1 倍
2. 審查費是誰要出
3. 每月電錶數據需提供照片







法蘭摩沙 - 鎮寶、名淙、俊雄

Tube 管安裝：35%

儀表安裝：100%

儀表結線：92%

總進度：89.9%

案場協調項目：

1. 亞通管路組修改餘 1 處（無法蘭）

施工進度表

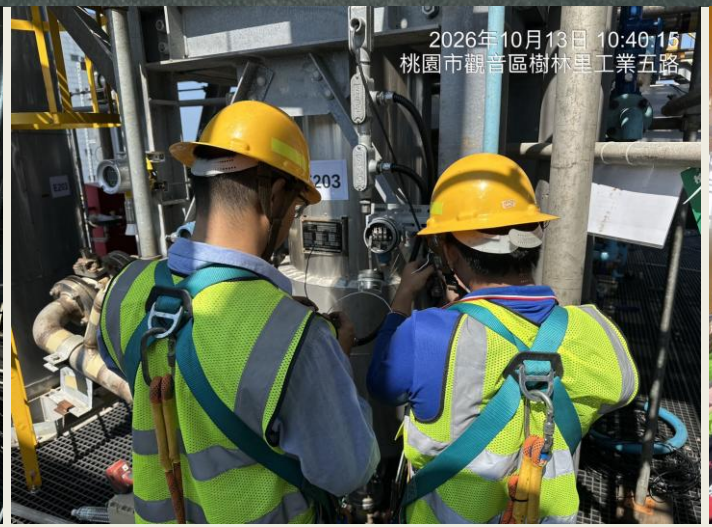
										二次側					盤數	一次側					TUBE管	
								點位		配管	配線	導通&絕緣	箱體結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線		配管	完成數量
6F	SAJB 11006	AJB 11022	DJB 11019	UJB 11010						37	37	37	37	37		4	4	4	4	7F		3
		24	10	3				數量：	37						4						3	
5F	SAJB 11005	DJB 11017	UJB 11009	AJB 11019	AJB 11021	AJB 11020	DJB 11018			115	115	115	115	85		7	7	7	7	5F		16
		14	15	24	23	24	15	數量：	115						7						29	
4F	SIDJB 11006	DJB 11015	APJB 11004	AJB 11017	UJB 11008	DJB 11014				199	199	199	199	100		12	12	12	12	4F		40
	8	20	9	24	18	17																
	DJB 11013	AJB 11016	UJB 11007	AJB 11018	DJB 11016																	
	20	24	15	24	20			數量：	199						12						47	
3F	SIDJB 11005	AJB 11012	APJB 11003	DPJB 11004	DJB 11009	UJB 11006				319	319	319	319	214		18	18	18	18	3F		5
	17	23	14	12	18	12																
	DJB 11010	AJB 11010	UJB 11004	DJB 11008	DJB 11012	AJB 11014																
	17	24	11	19	15	24																
	UJB 11005	AJB 11011	AJB 11013	DJB 11011	AJB-11015																	
	17	24	24	24	24			數量：	319						18						71	
2F	SAJB 11002	SIDJB 11003	SIDJB 11004	DPJB 11003	APJB 11002	UJB 11003	AJB 11009			279	279	279	279	208		14	14	14	14	2F		6
		16	22	16	15	21	24															
	DJB-11004	DJB 11005	DJB-11006	DJB 11007	AJB-11006	AJB 11007	AJB 11008															
	24	23	23	23	24	24	24	數量：	279						14						47	
1F	SAJB 11001	SIDJB 11001	SIDJB 11002	UJB-11001	UJB 11002	AJB-11023				351	351	351	351	234		18	18	18	18	1F		12
	7	19	10	17	17	14																
	DPJB 11001	APJB 11001	DPJB 11002	DJB 11001	DJB 11002	DJB 11003	DJB-11020															
	24	17	19	24	23	24	19															
	AJB 11001	AJB 11002	AJB 11003	AJB 11004	AJB11005			數量：	351						18						35	
	22	24	24	23	24																	
								總數	1300	1300	1300	1300	1300	878	73	73	73	73	73		232	82

F區儀表	總數	到料	已完成
	571	571	571

拉線	配管	儀錶安裝	導通&絕緣	結線	TUBE管
1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.35

儀表安裝、配管工程


2026年10月13日 13:28:36
桃園市觀音區樹林里工業五路


2026年10月13日 10:40:15
桃園市觀音區樹林里工業五路


2026年10月13日 15:02:10
桃園市觀音區樹林里


2026年10月13日 09:55:09
桃園市觀音區樹林里經建一路


2026年10月13日 09:28:28
桃園市觀音區樹林里工業五路

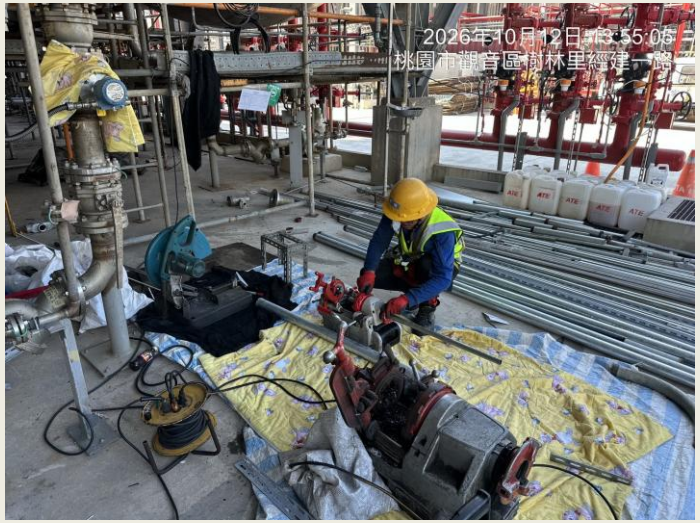

2026年10月13日 15:45:45
桃園市觀音區樹林里

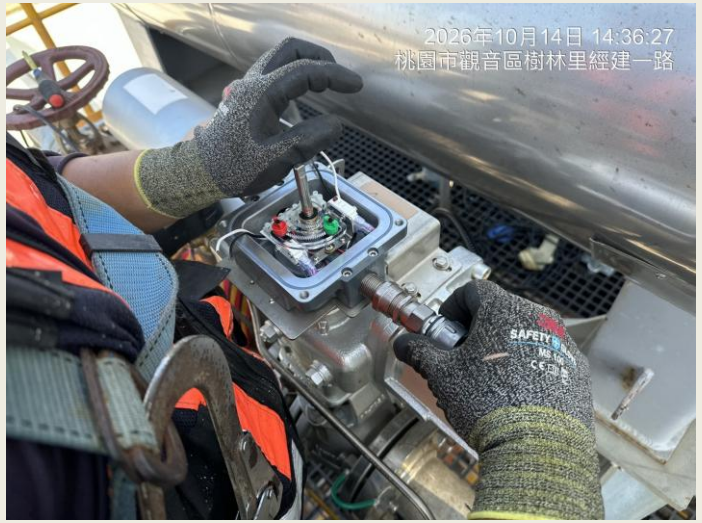
儀表安裝、配管工程


2026年10月14日 14:50:22
桃園市觀音區樹林里


2026年10月14日 13:41:11
桃園市觀音區樹林里


2026年10月14日 14:51:54
桃園市觀音區樹林里


2026年10月12日 13:55:06
桃園市觀音區樹林里經建一路


2026年10月14日 14:36:27
桃園市觀音區樹林里經建一路


2026.10.15 10:24
