綠源科技股份有限公司
Green Source Technology

工程部週報

2026/11/02 ~ 2026/11/06

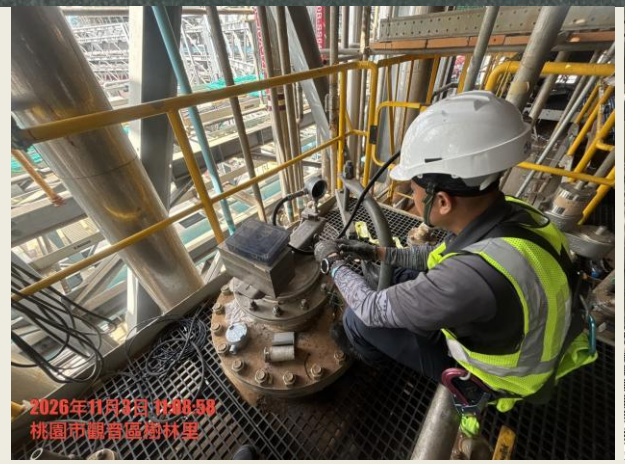


法蘭摩沙 - 鎮寶、俊雄

總進度：93.7%

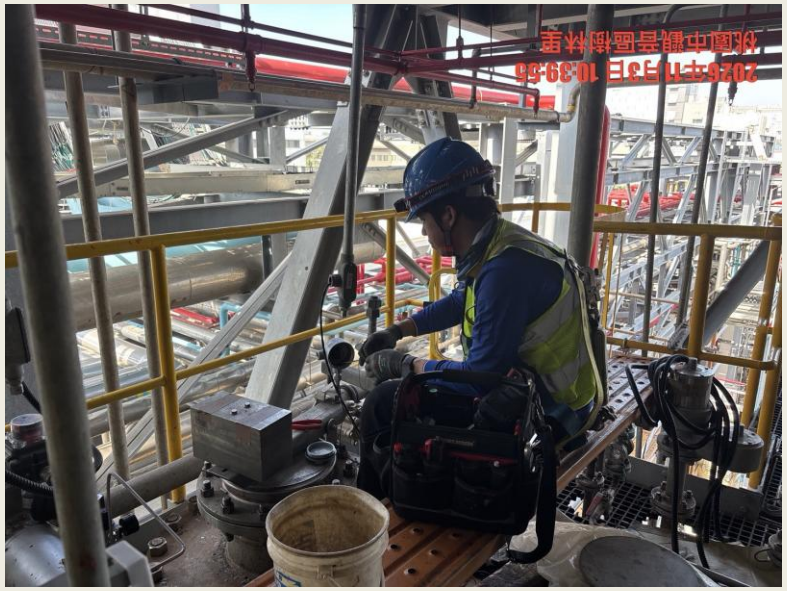
六	F區(110區)									
1	JB安裝	30	**2025/12/1**	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	**RSG配管**	120	**2026/4/5**	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	100%
3	拉線	150	**2026/4/16**	2026/9/12	100%	170	2026/4/23	2026/10/9	100%
4	絕緣/導通測試	20	**2026/8/17**	2026/9/5	100%	87	2026/7/1	2026/9/25	100%
5	儀表安裝	130	**2026/5/20**	2026/9/26	100%	135	2026/5/28	2026/10/9	100%
6	安裝Tube	80	**2026/7/10**	2026/9/27	30%	30	2026/9/30	2026/10/29	100%
7	**儀表結線**	30	**2026/9/1**	2026/9/30	100%	123	2026/7/1	**2026/10/31**	100%
七	測試驗收								
1	迴路測試	15	**2026/9/30**	2026/10/14	100%	30	2026/10/31	2026/11/29	21%
2	功能測試	15	**2026/9/30**	2026/10/14	100%	30	2026/10/31	2026/11/29	21%
3	驗收及結案報告	30	**2026/10/1**	2026/10/30	100%	30	2026/10/30	2026/11/28	24%
				343	98.1%			372	93.7%

儀表安裝、配管工程


2026年11月3日 11:00:58
桃園市觀音區樹林里


2026年11月3日 15:46:07
桃園市觀音區樹林里成功路一段

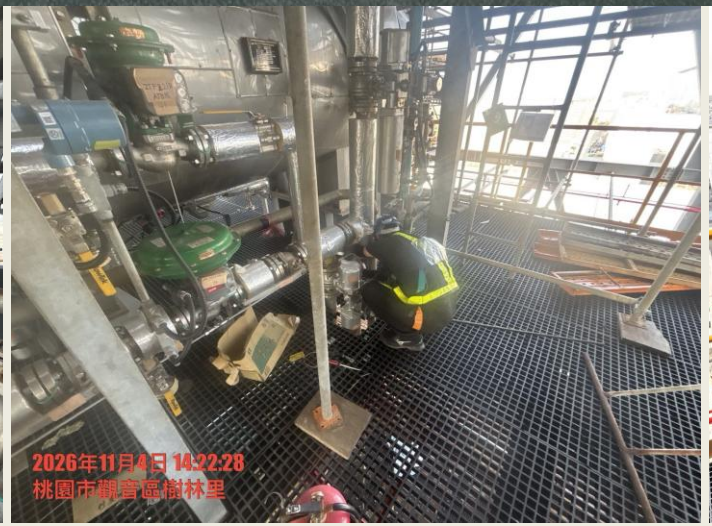

E209




2026年11月3日 16:35:22
桃園市觀音區樹林里

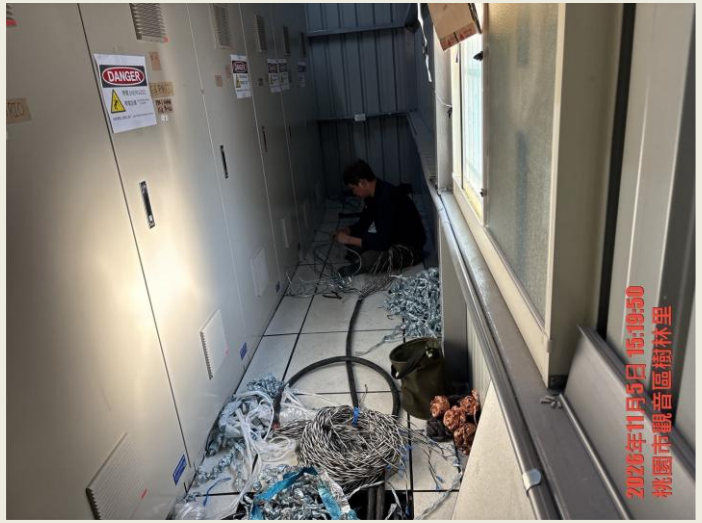
儀表安裝、配管工程

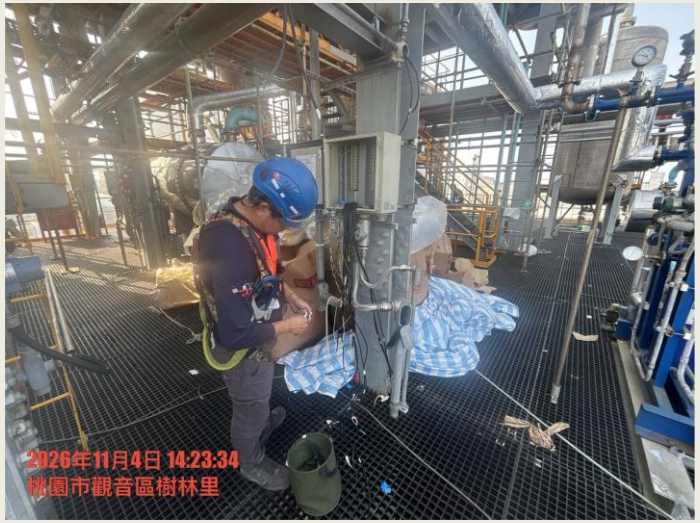

2026年11月4日 14:47:15
桃園市觀音區樹林里經建一路


2026年11月4日 14:22:28
桃園市觀音區樹林里


2026年11月4日 10:05:13
桃園市觀音區樹林里工業五路


2026年11月5日 13:54:05
桃園市觀音區樹林里經建一路


DANGER
2026年11月5日 15:19:50
桃園市觀音區樹林里


2026年11月4日 14:23:34
桃園市觀音區樹林里
