綠源科技股份有限公司
Green Source Technology

工程部週報

2026/10/27 ~ 2026/10/30



法蘭摩沙 - 鎮寶、名淙、俊雄

Tube 管安裝：74%

儀表結線：96%

總進度：91.9%

六	F區(110區)								
1	JB安裝	30	**2025/12/1**	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	**RSG配管**	120	**2026/4/5**	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	100%
3	拉線	150	**2026/4/16**	2026/9/12	100%	170	2026/4/23	2026/10/9	100%
4	絕緣/導通測試	20	**2026/8/17**	2026/9/5	100%	87	2026/7/1	2026/9/25	100%
5	儀表安裝	130	**2026/5/20**	2026/9/26	100%	135	2026/5/28	2026/10/9	100%
6	安裝Tube	80	**2026/7/10**	2026/9/27	30%	30	2026/9/30	2026/10/29	74%
7	**儀表結線**	30	**2026/9/1**	2026/9/30	100%	120	2026/7/1	**2026/10/28**	96%
七	測試驗收								
1	迴路測試	15	**2026/9/30**	2026/10/14	100%	15	2026/10/28	2026/11/11	14%
2	功能測試	15	**2026/9/30**	2026/10/14	100%	15	2026/10/28	2026/11/11	14%
3	驗收及結案報告	30	**2026/10/1**	2026/10/30	100%	30	2026/10/30	2026/11/28	0%
				343	98.1%			372	91.9%

施工進度表

											二次側					盤數	一次側					TUBE管	
								點位		配管	配線	等通&壁線	箱盤結線	儀表結線		配管	配線	等通&壁線	結線		配管	完成數量
6F	SAJB 11006	AJB 11022	DJB 11019	IJB 11010						37	37	37	37	37		4	4	4	4	7F		3
		24	10	3				數量：	37						4						3	
5F	SAJB 11005	DJB 11017	IJB 11009	AJB 11019	AJB 11021	AJB 11020	DJB 11018			115	115	115	115	115		7	7	7	7	5F		29
		14	15	24	23	24	15	數量：	115						7						29	
4F	SIDJB 11006	DJB 11015	APJB 11004	AJB 11017	IJB 11008	DJB 11014				199	199	199	199	187		12	12	12	12	4F		47
	8	20	9	24	18	17																
	DJB 11013	AJB 11016	IJB 11007	AJB 11018	DJB 11016																	
	20	24	15	24	20			數量：	199						12						47	
3F	SIDJB 11005	AJB 11012	APJB 11003	DPJB 11004	DJB 11009	IJB 11006				319	319	319	319	285		18	18	18	18	3F		36
	17	23	14	12	18	12																
	DJB 11010	AJB 11010	IJB 11004	DJB 11008	DJB 11012	AJB 11014																
	17	24	11	19	15	24																
	IJB 11005	AJB 11011	AJB 11013	DJB 11011	AJB-11015																	
	17	24	24	24	24			數量：	319						18						71	
2F	SAJB 11007	SIDJB 11003	SIDJB 11004	DPJB 11003	APJB 11002	IJB 11003	AJB 11009			279	279	279	279	245		14	14	14	14	2F		26
		16	22	16	15	21	24															
	DJB-11004	DJB 11005	DJB-11006	DJB 11007	AJB-11006	AJB 11007	AJB 11008															
	24	23	23	23	24	24	24	數量：	279						14						47	
1F	SAJB 11001	SIDJB 11001	SIDJB 11002	IJB-11001	IJB 11002	AJB-11023				351	351	351	351	245		18	18	18	18	1F		30
	7	19	10	17	17	14																
	DPJB 11001	APJB 11001	DPJB 11002	DJB 11001	DJB 11002	DJB 11003	DJB-11020															
	24	17	19	24	23	24	19															
	AJB 11001	AJB 11002	AJB 11003	AJB 11004	AJB11005			數量：	351						18						35	
	22	24	24	23	24																	
								總數	1300	1300	1300	1300	1300	1114	73	73	73	73	73		232	171

F區儀表	總數	到料	已完成	拉線	配管	儀錶安裝	等通&壁線	結線	TUBE管
	571	571	571	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	0.74


儀表安裝、配管工程


2026年10月28日 08:50:12
桃園市觀音區樹林里成功路一段






2026年10月28日 14:03:48
桃園市觀音區樹林里

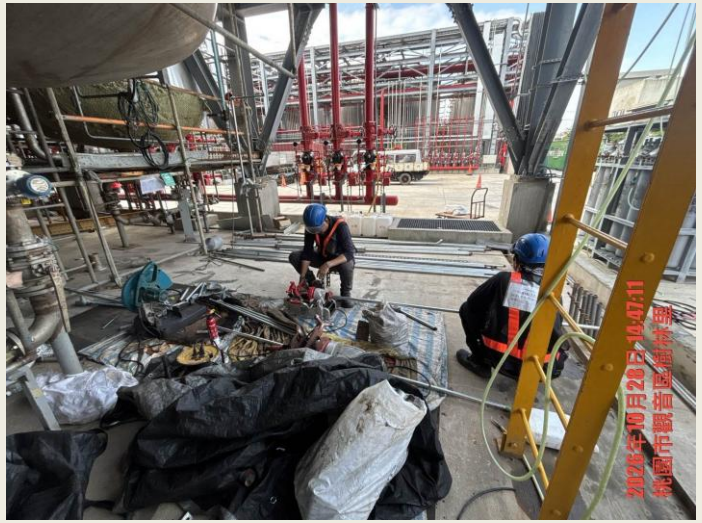


2026年10月28日 11:41:43
桃園市觀音區樹林里

兆豐銀行 - 白龍

- 工程事項：

1. 上週的螺絲跟水泥礅座算完成
2. 今天重驗及爹典檢查也完成

- 以下不能執行：

1. 螢幕未安裝：因業主電源還沒好
2. 接地系統：因業主接地箱還沒好
3. AC 箱併連：因業主還沒好，AC箱內等CT
