綠源科技股份有限公司
Green Source Technology

工程部週報

2026/11/09 ~ 2026/11/13



法蘭摩沙 - 鎮寶、俊雄


總進度：93.7%

案場協調項目：配合管路燒焊修改（儀表拆裝位移）、配合保溫隔熱棉包覆（電管移位）


六	F區(110區)								
1	JB安裝	30	**2025/12/1**	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	**RSG配管**	120	**2026/4/5**	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	100%
3	拉線	150	**2026/4/16**	2026/9/12	100%	170	2026/4/23	2026/10/9	100%
4	絕緣/導通測試	20	**2026/8/17**	2026/9/5	100%	87	2026/7/1	2026/9/25	100%
5	儀表安裝	130	**2026/5/20**	2026/9/26	100%	135	2026/5/28	2026/10/9	100%
6	安裝Tube	80	**2026/7/10**	2026/9/27	30%	30	2026/9/30	2026/10/29	100%
7	**儀表結線**	30	**2026/9/1**	2026/9/30	100%	123	2026/7/1	**2026/10/31**	100%
七	測試驗收								
1	迴路測試	15	**2026/9/30**	2026/10/14	100%	30	2026/10/31	2026/11/29	41%
2	功能測試	15	**2026/9/30**	2026/10/14	100%	30	2026/12/1	2026/12/30	0%
3	驗收及結案報告	30	**2026/10/1**	2026/10/30	100%	30	2026/11/5	2026/12/4	24%
				343	98.1%			378	93.7%


迴路查驗


2026年11月11日 13:59:30
桃園市觀音區樹林里經建一路

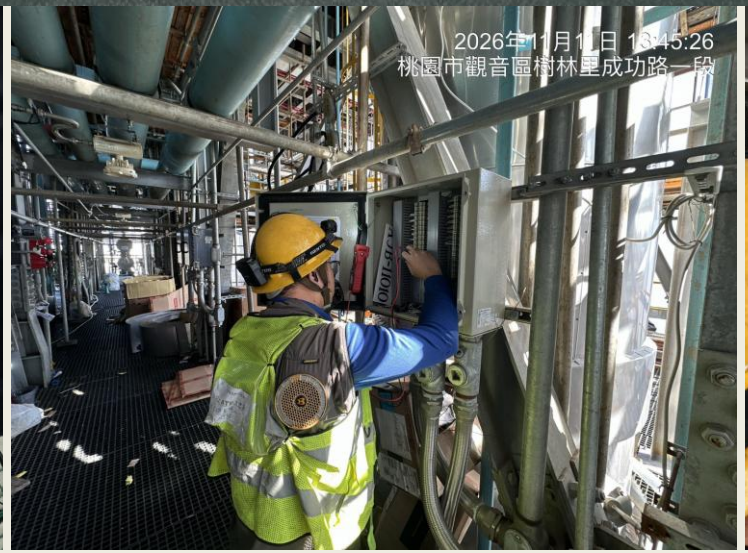
2026年11月11日 13:45:26
桃園市觀音區樹林里成功路一段



2026年11月11日 14:48:18
桃園市觀音區樹林里經建一路

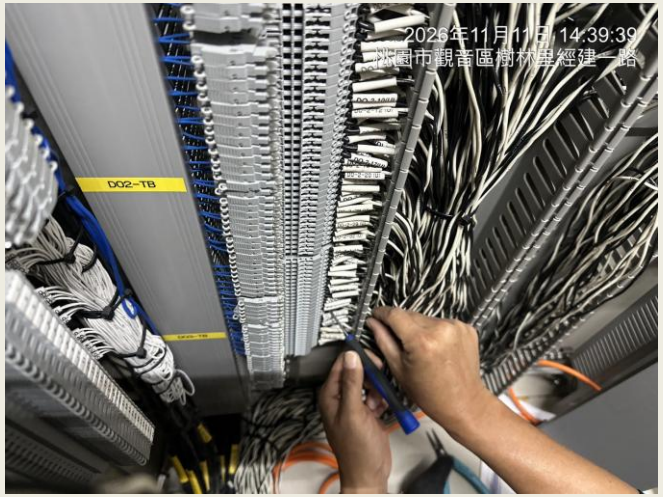
2026年11月11日 14:39:39
桃園市觀音區樹林里經建一路
D02-TB

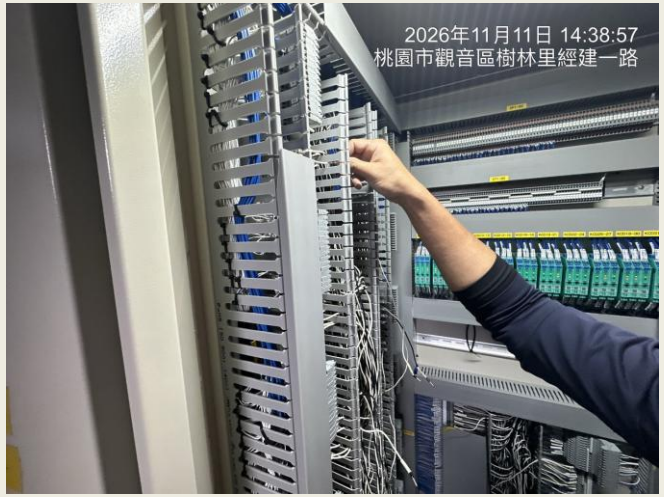

2026年11月11日 14:38:57
桃園市觀音區樹林里經建一路


2026.1110 14:05

配管，空氣導管工程

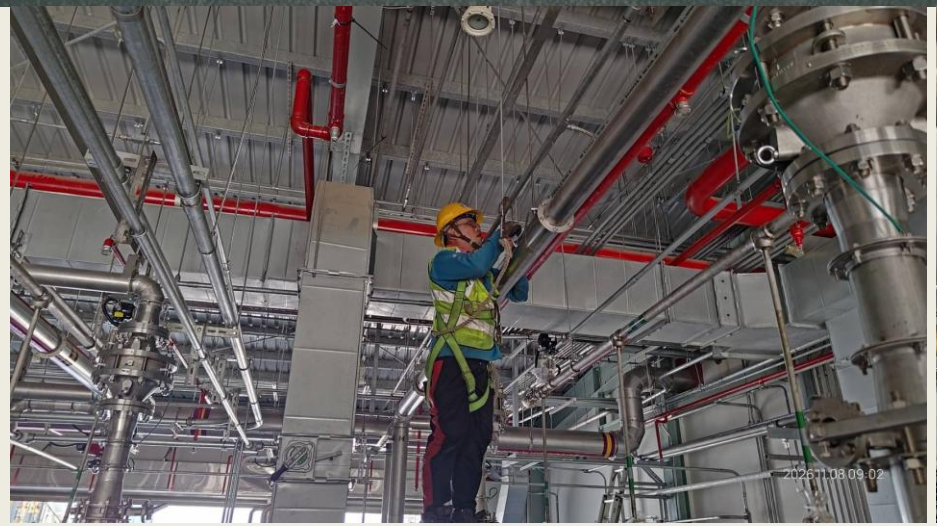



2026年11月11日 10:59:16
桃園市觀音區樹林里經建一路

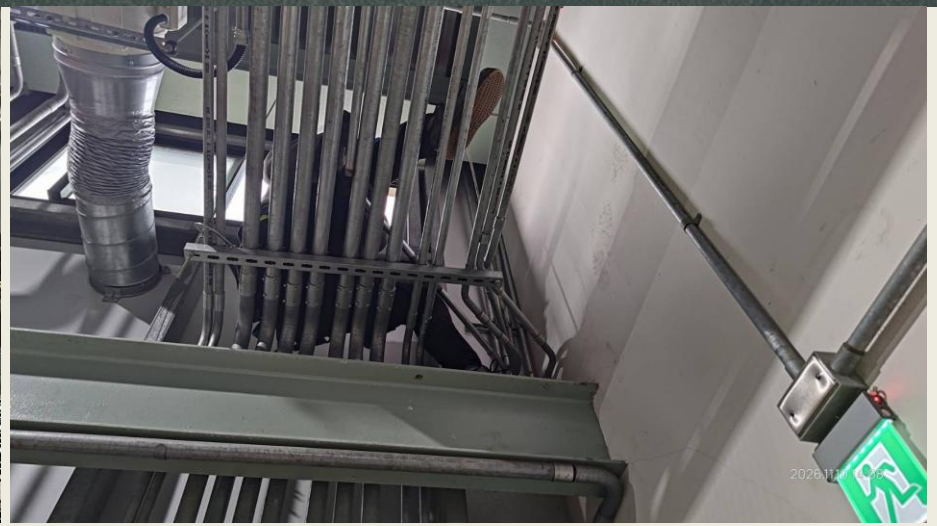


消防栓
HYDRANT
2026.1110 14-10


ZAIXA INSULATION
Pipe Insulation
2026.11.08 13:30

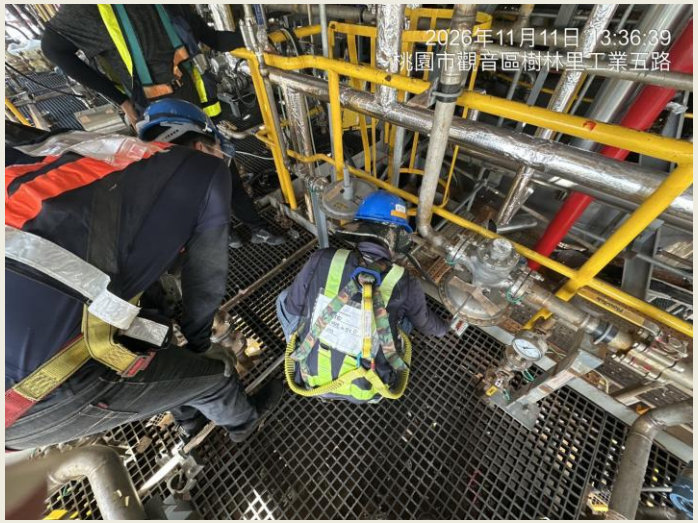
2026年11月11日 13:36:39
桃園市觀音區樹林里工業五路

主幹管轉向配合拆卸









2026年11月12日 09:03:29
桃園市觀音區樹林里成功路一段


2026年11月12日 08:50:37
桃園市觀音區樹林里成功路二段

創奕學甲 - 鎮寶、俊雄



新設平台

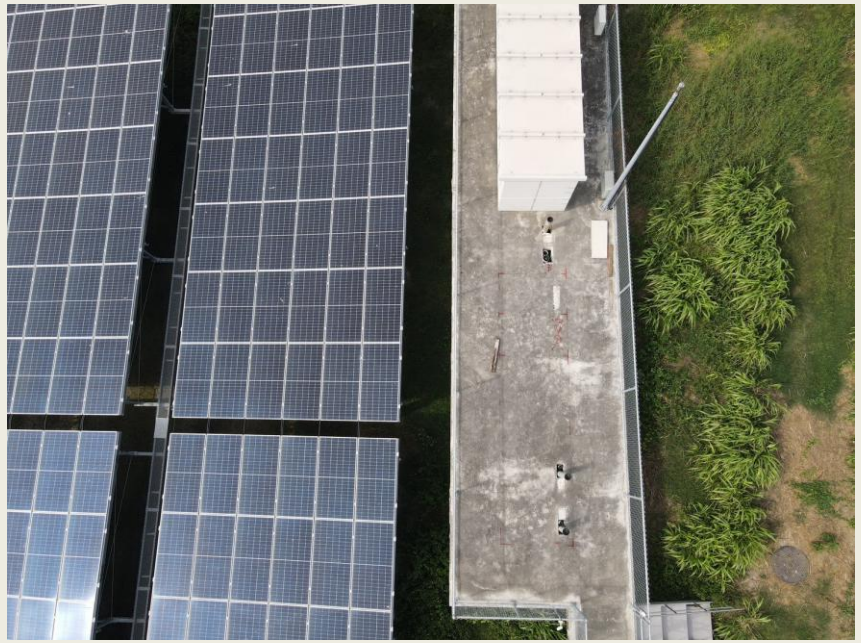

案場全景




既設平台


平台放樣，人孔管路





2026年11月10日 12:18:42
臺南市學甲區平和里西平寮

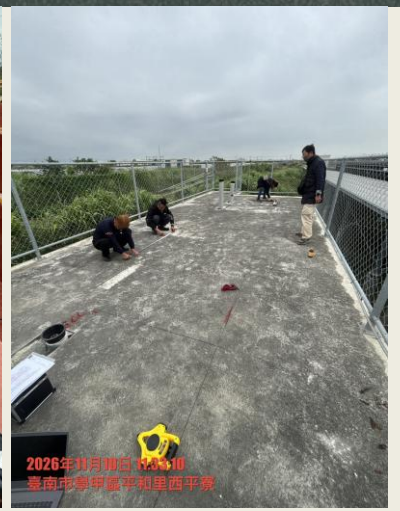
2026年11月10日 11:53:10
臺南市學甲區平和里西平寮


2026年11月10日 12:23:15
臺南市學甲區平和里西平寮

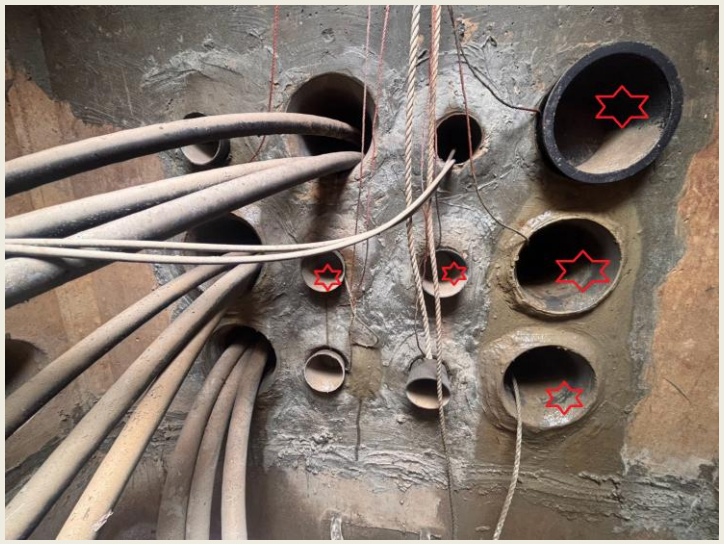

景碩 - 名淙

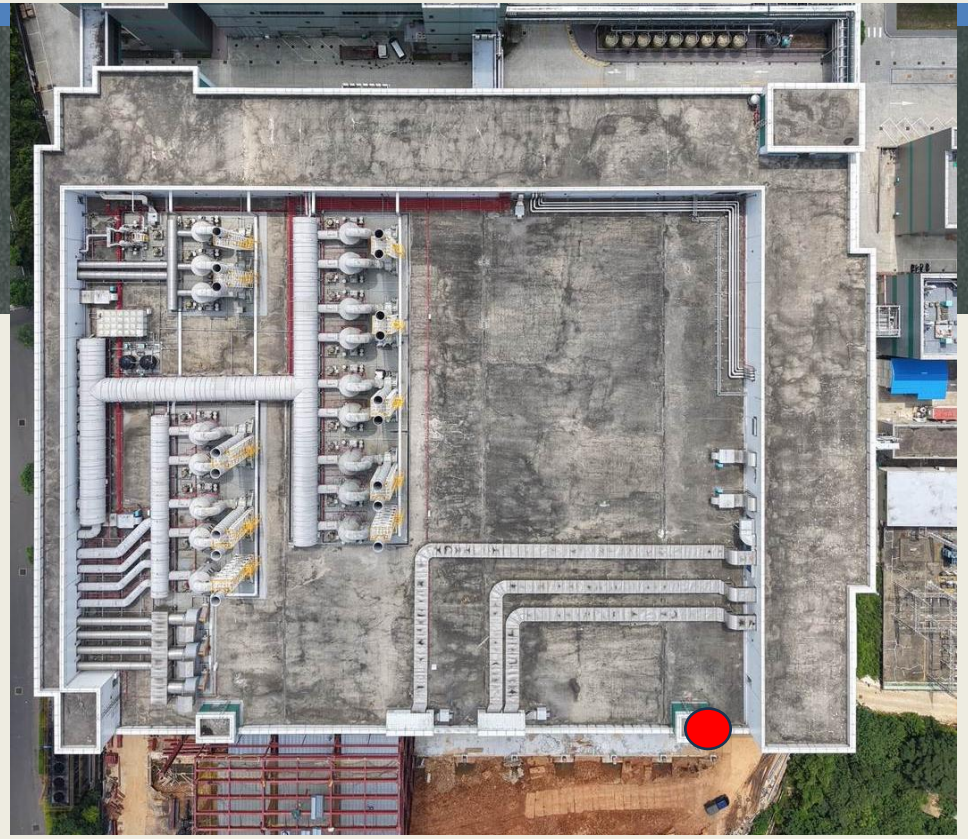

六樓施工放樣：100%

六樓模板工程：60%

六樓鋼筋工程：60%

- 重要事項：


1. 景碩電力鄧主任於 11/5 提出，自重塊施作位置在門前方會影響設備進出，設計於11/10 到場現勘與業主說明，於11/13 下午 14:00 尚在等業主回覆，自重塊調整方案是否可行
2. 預計 11/21 六樓 128 個自重塊混凝土澆置

空拍圖

：此顏色方塊區域
模板、鋼筋
已施工完成



自主檢查

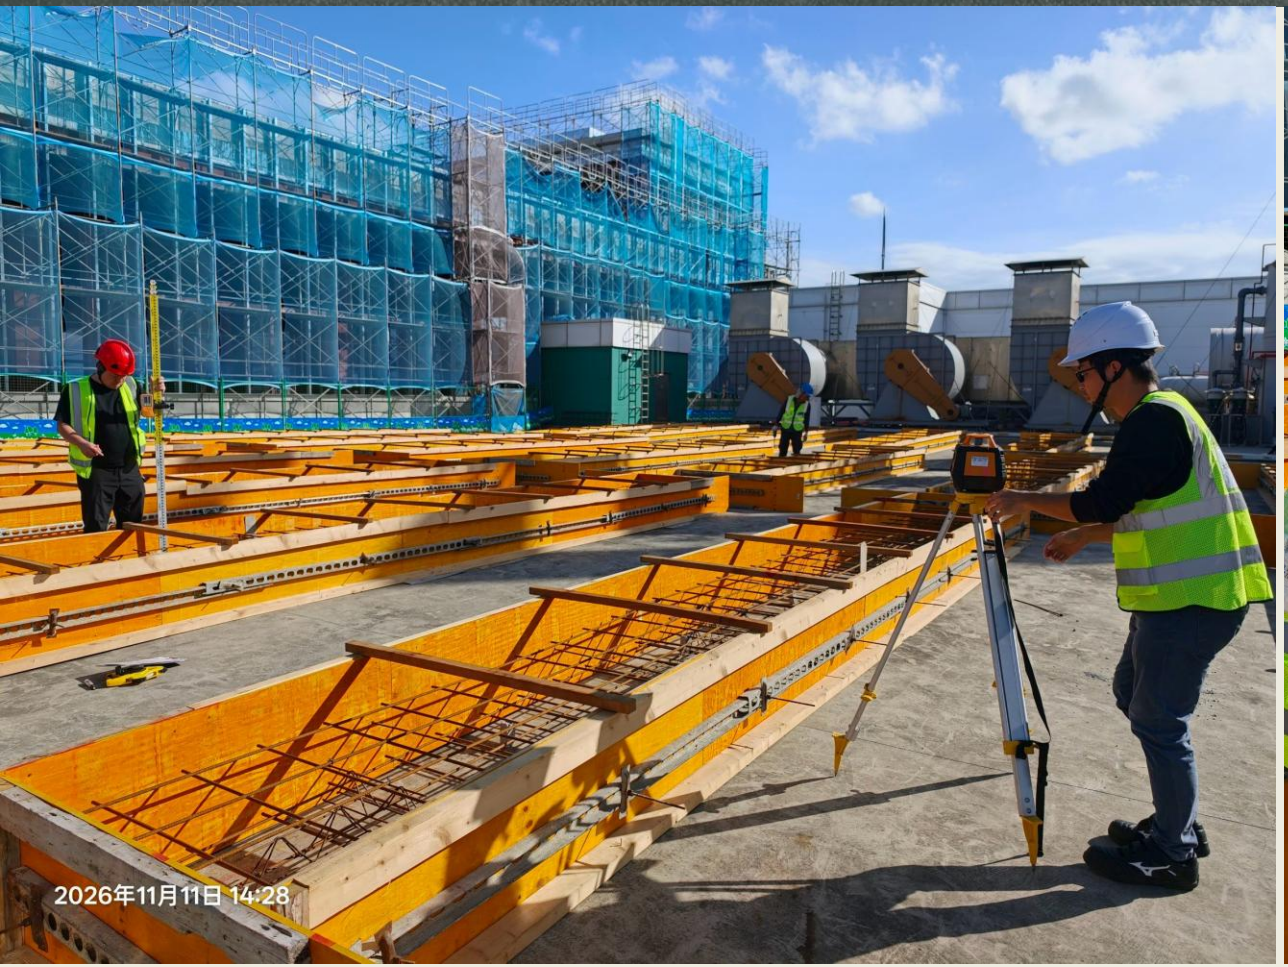

量測高程



自重塊自主檢查

本週施工現況





